

국방논단

제2008호(24-35) 2024년 9월 25일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

글로벌 무기체계 구매 사례와 국내구매 제도 개선을 위한 시사점

김병주 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
bjkim@kida.re.kr

최용호 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
gogho@kida.re.kr

무기체계 국내구매 제도 개선을 위해 최근 미국과 호주의 무기체계 구매사업 사례에 대해 알아보았으며, 이를 통해 국내 방위산업의 발전을 위해 다음과 같은 사항에 대한 제도적인 개선이 필요한 것으로 확인하였다. 우선, 국내구매 사업의 경우 현재 업체가 시험평가 비용을 전부 부담하고 있으나 이는 업체에게 재정적 부담이 되며, 국내구매 사업 참여를 억제하는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서, 시험평가 비용에 대한 계약 및 보상관련 규정을 개정하여 정부의 지원 또는 부담 분담 방안을 마련하여 업체의 재정적 위험을 감소하고 사업 참여를 촉진하는 것이 필요하다. 두 번째로 현재의 제도는 완성된 무기체계만을 대상으로 하여 시험평가를 수행하고 있다. 그러나 기술 개발의 초기 단계에서는 프로토타입의 개발과 테스트를 통해 점진적인 개선을 추구하는 방식이 더 효과적일 수 있으므로 국내구매 제도에서도 프로토타입 개발 및 테스트에 대한 지원과 함께, 개선 과정을 통한 기술 발전을 장려하는 제도적 조치가 필요하다. 이와 같은 개선은 국내 방위산업의 경쟁력 강화 및 기술 혁신을 촉진하는데 중요한 역할을 할 수 있으며, 국내구매 제도의 효율성과 효과성을 높이는 데 기여할 것이다.

최근 국내방산 업체가 자체 개발한 무기체계로 호주에서 시험평가를 통과하고 구매사업의 우선협상 대상으로 선정되었다는 소식은 방산 업체의 기술력 향상을 상징적으로 보여주는 사례이다. 이는 전통적인 국가 주도의 연구개발 및 무기체계 확보 방식에서 민간 부문의 고도화된 기술력을 기반으로 한 무기체계의 전력화로의 전환이 증가할 수 있음을 보여주는 예시이다. 특히, 무인항공기, 인공지능 등을 활용한 무기체계는 민간 부문의 선진적인 제어, 센서 인식 기술, 자율 주행, 데이터 활용 및 응용 등의 능력이 군사 기술을 앞서 있어 무기체계 획득 시 민간의 앞선 기술이 적용된 시스템을 도입하거나, 필요에 따라 개조하는 방식으로 구매하여 전력화하는 사례가 증가할 것으로 전망된다.

그러나 민간업체의 비약적인 기술 발전에도 불구하고, 한국에서는 방산 업체가 자체 개발한 무기체계를 국내구매로 전력화하는 경우는 드문 실정이다. 이는 방산 업체와 국가 간의 관계, 방위산업의 특수성 등 다양한 요인에서 원인을 찾을 수 있다. 방산 업체 관계자에 따르면 국내구매 제도의 경우 업체에서 부담해야 하는 위험이 많아 경영진에서 참여 결정을 주저하며, 주된 위험요인으로는 시험평가와 관련된 비용 부담과 무기체계가 완벽하게 완성돼야 한다는 소요군의 관점을 지목했다.


본고에서는 국내구매 제도의 개선 방향을 모색하기 위해 국내구매 제도에 대해 간략하게 알아보고, 미국과 호주의 무기체계 획득 제도와 무기체계 구매를 결정한 최근 사례를 통해 시사점과 개선 방안을 논의한다.

국내구매 제도 현황

무기체계 구매는 방위력개선사업의 일환으로 군사력 강화를 도모하는 수단 중 하나이다(방위사업법 제3조 1항). 「방위사업법」에 의하면, 구매 절차와 관련된 필수 사항들은 대통령령을 통해 정해져야 하며 현재 구매 절차는 「방위사업관리규정」에 명시되어 있다. 해당 규정의 제4장 제2절, 제125조에 따르면 구매절차는 구매계획 수립, 업체 제안 접수, 제안서 평가 및 시험평가 대상 무기체계 혹은 장비의 선정, 시험평가, 기종 결정, 구매 계약 체결의 과정으로 구성되어 있다.

구매는 크게 규격품과 규격품 외로 나눌 수 있다. 규격품을 구매하는 경우는 전투용 적합 판정을 받은 국방규격품과 KS인증 등을 받은 민수규격품으로 나눌 수 있고, 규격품 외 구매는 상용 기술을 응용하거나 기존 장비를 개량하여 구매하는 경우가 대표적이다. 민수규격품과 국방규격품 구매는

국가계약법에 따라 일반경쟁 방식 등으로 추진하게 되지만, 규격품 외 품목을 구매하는 경우는 「무기체계 구매사업 제안서 및 기종결정 평가 지침」에 따라 협상에 의한 계약으로 진행되고, 시험평가가 수행된다.

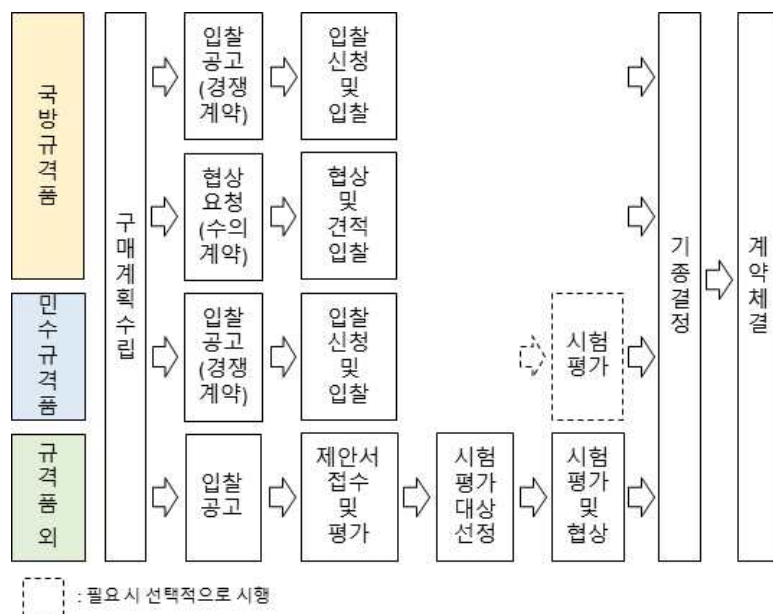

〈그림 1〉 무기체계 국내구매 절차

구매 절차에서 시험평가 단계는 가장 긴 시간이 걸리는 과정으로, 무기체계의 주요 작전운용성능, 기술적/부수적 성능, 합동성 및 상호운용성, 군 운용 적합성, 전력화지원요소 충족성 등의 항목으로 구성된다. 각 항목에 대한 시험평가는 업체가 속한 국가의 정부가 작성하거나 인정한 자료, 국제인증기관이 작성한 자료, 합참이 인정한 기관이 작성한 자료를 근거로 수행하고 있다. 국외구매의 경우 대부분 운영 중인 체계를 대상으로 하여 해당 운영 국가의 인증 자료가 존재하여 자료에 의한 평가를 위주로 시험평가를 수행한다. 그러나 방산 업체에서 자체적으로 개발한 무기체계의 경우 대부분 시험평가 항목에 대한 정부에서 인증하는 평가 자료가 확보되어 있지 않으므로, 소요군과 합참은 전력화에 문제가 없도록 3계절 시험, 환경시험, 내구도 시험 등을 포함한 운용시험평가 수준의 시험평가를 요구하고 있다.

상술한 절차로 인해 업체에서 자체 개발한 무기체계를 국내구매 절차를 따라 획득 시에는 시험평

가를 위한 비용이 필연적으로 발생하게 된다. 운용시험평가 수준의 시험평가를 위해서는 적어도 2세트의 무기체계 시제가 필요하며, 환경시험, 내구도 시험 등 각종 시험평가 수행이 필요하다. 그러나 현재 「전력발전업무훈령」, 「방위사업관리규정」 등에는 국내구매 시 시험평가 비용 부담 주체에 관해 규정하지 않고 있으며, 업체에서 관련된 비용을 모두 부담하고 있다. 그러므로 시험평가에서 최종 탈락한 업체는 투자한 비용을 보상받을 방법이 없으며 국내구매 사업 참여를 원하는 업체는 재무적인 위험을 감수해야만 한다. 최종적으로 선정된 업체 또한 가격적인 우위 확보를 위해 저가로 입찰하기도 하고, 방위사업청과의 협상 등에 따라 최종 납품단가를 결정하므로 시제 및 시험평가 비용의 일부만 보상을 받는 것으로 알려져 있다.

이러한 상황은 업체들의 국내구매 사업에 대한 부정적인 인식을 심화시키고 있으며 이로 인한 실질적인 문제가 발생하고 있다. 방위사업청 관계자에 따르면, 기개발된 장비를 일부만 개조하여 특수 용도로 활용하기 위한 사업에서, 상용 기술로 충분히 개조가 가능한 수준의 작전운용성능임에도 불구하고 해당 장비를 공급할 수 있는 유일한 업체가 국내구매 제도에 부담을 느껴 연구개발로 진행한 사례도 있다고 한다. 정부의 불필요한 지출을 줄이고자 시험평가 비용을 업체에게 전가하는 행위가 오히려 사업기간과 비용의 상승으로 되돌아온 꼴이다.

반면, 국가기관 소프트웨어사업은 낙찰자가 아닌 경우에도 제안서 작성에 대한 보상을 할 수 있도록 하고 있다. 「소프트웨어 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따르면, “제안서 보상사업인 경우 제안서 보상 대상자에게 제안서 작성비의 일부를 보상하기 위하여 해당 사업예산의 13/1000에 해당하는 금액을 제안서 보상예산으로 별도 확보하여야 한다.”고 명시되어 있다. 이는 사업에 참여하는 업체들이 제안서 작성 과정에서 발생하는 비용을 일부 보전받을 수 있도록 하여 재정적인 부담을 줄이고, 보다 질 높은 제안서를 제출할 수 있도록 하고 있다.

결과적으로 현재 시험평가 등 과정에 대한 보상이 이루어지지 않고 있어 방위력개선사업의 국내구매는 비교적 단가가 낮은 무기체계 나 핵심 기술 개발, 신개념기술시범(Advanced Concept Technology Demonstration)¹⁾ 사업 등을 통해 시제를 개발하고 시험평가를 완료한 사업에 한정되고 있다. 국내 업체의 높은 기술력을 활용한 국내구매 활성화를 위해 국내·외의 사례 연구를 통해 국내구매 제도에 대한 개선이 필요한 시점이다.

1) 현재는 관련 규정이 폐지되고 신속시범사업으로 통합되었으나, 이해를 돕기 위해 비교적 널리 알려진 제도를 언급함.

글로벌 무기체계 구매 사례

미국의 Next Generation Squad Weapons Prototyping 사례

미국의 획득제도에서 중간단계획득(Middle Tier of Acquisition, 이하 MTA) 절차가 우리나라의 국내구매 제도와 일부 유사하다고 볼 수 있다. 미국은 획득제도를 '20년 적응형 국방획득모델²⁾(Adaptive Acquisition Framework)을 정립하면서 획득사업의 특성에 따라 조정이 가능한 6개의 획득절차로 개선하였다. 6개의 획득절차 중 MTA는 '20년에 신규 도입된 절차로 기존의 획득 프로세스를 간소화하여 방위산업의 신기술을 빠르게 적용하고 새로운 위협에 신속하게 대응하기 위해, 신속한 개발과 배치를 가능하게 하는 것을 목적으로 하고 있다. MTA는 세부적으로 Rapid Prototyping과 Rapid Fielding 두 가지 경로로 나뉘지며, 그중 Rapid Fielding은 기존 기술 또는 새로운 운용 개념을 활용하여 5년 이내에 전투용 시스템이나 제품을 배치하는 것을 목표로 하고 있어, 검증된 기술을 활용하여 무기체계를 전력화하는 점에서 우리나라의 국내구매를 통한 획득과 유사하다 볼 수 있다.

최근 MTA 절차를 통해 무기체계를 획득하고 있는 사업으로 Next Generation Squad Weapons(이하 NGSW)³⁾ 사업이 있다. NGSW 사업은 미 육군 보병 분대의 사거리 확장과 효과도가 증대된 차세대 화기체계 확보를 목표로 추진되고 있다. 미 육군은 NGSW 사업의 기술적인 향상을 통해 기존 무기 대비 높은 정확도, 사거리, 효과도 향상을 기대하고 있으며, 새로운 형태의 6.8mm 탄약 확보와 증강현실·야간 투시 등의 기능을 조준경 등의 부가 시스템에 통합 등을 사업에 포함하여 추진하고 있다.

NGSW 사업은 2017년 요구사항을 정의하면서 프로그램을 시작하였으며, 2018년 사업에 대한 최초 공고를 진행하였다. 이후 Textron, General Dynamics, FN America, PCP Tactical, LLC 및 SIG Sauer 등의 업체가 참가하였으며, 2018년~2020년에는 참여 업체의 시제에 대해 기술적, 환경적 평가와 사용자 중심의 디자인을 위한 사용자 평가를 수행하였다. 시제 평가 간에 미 육군은 소총 시제 96정, 탄약 시제 약 85만 발 제공을 위해 SIG Sauer, General Dynamics, Textron 3개 업체가 각 \$9.1M, \$68.9M, \$65.7M으로 계약⁴⁾을 체결하였다. 2021년~2022년에는 앞선 시험평가에

2) Department of Defense Instruction 5000.02 참고

3) “BIG MOVES FOR SMALL ARMS SYSTEMS”, US Army Acquisition Support Center (2022. 11. 21.)

4) 계약번호 W15QKN-19-9-1022, W15QKN-19-9-1024, W15QKN-19-9-1025(fpds.gov, 검색일: 2024. 1. 25.)

서 제기된 개선 요구사항을 반영한 시제에 대해 추가 시험평가와 사용자의 경험, 의견 등을 검토하였으며, 2022년 최종적으로 SIG Sauer, Vortex Optics, Winchester의 체계로 결정하였다. 2023년 이후 현재 시스템을 최종 검증하고 육군 전체에 배치할 계획이다.

미국의 NGSW 사업은 시제를 업체로부터 제공받아 시험평가를 수행하고 이를 기반으로 대상기종을 결정하는 점에서 한국의 국내구매 방식과 유사하지만 일부 차이점이 존재한다. 그중 가장 큰 차이점은 업체들이 시험평가를 위한 시제를 무상으로 제출하는 것이 아니라, 정부와의 계약을 통해 시제제작과 시험을 수행하며 이에 대한 비용을 보상받는다라는 점이다. 계약의 세부사항과 업체의 투자비용 보상 등에 대한 구체적 정보는 제한적이지만, 정부가 시험을 위한 시제 비용과 시험평가 비용을 부담한다는 것은 계약정보를 통해 확인할 수 있었다. 이와 같은 계약은 획득 프로세스에 참여하는 업체들의 시험평가를 위한 재정적 부담을 줄이는 점에서 중요한 차별점을 제공한다.

호주의 Land 400 Phase 3 사업 사례

호주의 무기체계 획득제도는 One Defense Capability System(이하 ODCS)을 바탕으로 전력 획득과 운영을 수행하고 있다. ODCS는 국방 능력 관리 및 획득을 위해 전략적 계획, 능력 개발, 획득 및 유지보수를 포함하여 국방 능력의 전 생애주기를 아우르는 포괄적인 접근 방식을 제공하는 통합된 시스템으로, 국방 능력을 효과적으로 관리하고 발전시키기 위해 다양한 부서와 프로세스를 하나의 통합된 체계로 조직하는 것을 목표로 하고 있다.

ODCS⁵⁾는 네 가지 단계로 구성되며 각 단계는 다음과 같다. 전략 및 개념단계(Strategic and Concepts Phase)는 정부의 전략적 위협 평가와 우선순위를 바탕으로 전략적 지침과 통합 전력 설계를 구성한다. 위험 완화 및 요구 사항 설정 단계(Risk Mitigation and Requirement Setting Phase)는 통합 전력 설계를 통해 식별된 우선순위에 따라 각 무기체계의 작전운용성능, 위험 관리 전략 등을 수립한다. 획득 단계(Acquisition Phase)는 인력, 조직, 교육 및 훈련, 물자, 시설 및 부대, 지원 등의 모든 구성 요소가 예정대로 구현되어 무기체계의 능력 발휘될 수 있도록 보장하도록 배치하는 것을 목적으로 하고 있으며, 획득 과정에서 발생할 수 있는 위험 또한 관리하는 단계이다. 사용 및 폐기 단계(In-Service and Disposal Phase)는 적절한 준비 수준으로 무기체계를 유지하며, 필요에

5) *Defense Capability Manual*, Australia Government Department of Defense (2022. 4. 4.)

따라 작전에 운용하기 위해 합동 작전 사령관 또는 기타 작전 사령관에게 배정되어 사용되며, 수명이 다한 무기체계는 철수되고 폐기하는 단계이다.



〈그림 2〉 호주의 무기체계 획득제도(ODCS) 절차

최근 ODCS 단계를 거쳐 획득을 진행하는 사업은 한화 에어로스페이스가 최종적으로 수출에 성공한 지상 전투 차량 체계(Land Combat Vehicle System, 사업번호: Land 400 Phase 3, 이하 LCVS) 사업이 있다. LCVS 사업은 호주 육군의 장갑 전투차량 능력을 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 호주 육군의 기존 M113 장갑차를 대체하는 보병전투차량(Infantry Fighting Vehicle, IFV)과 이와 관련된 기동을 지원하기 위한 차량을 획득하는 사업이다.

IFV 획득 사업은 2015년~2016년 경쟁 입찰 및 제안 요청을 시작으로 사업이 시작되었으며, BAE 시스템, General Dynamics 등의 여러 업체가 입찰하였다. 이후 제안서 평가 과정을 거쳐 2019년 한화 디펜스 호주와 라인메탈 호주(Rheinmetall Defense Australia)가 최종 후보로 선정되었다. 호주는 2019년에 최종 후보로 선정된 한화 및 라인메탈사와 각각 \$50M에 시험평가를 위한 시제 3대를 납품하는 계약을 체결하였다.⁶⁾ 2019년~2022년까지 호주군은 제공받은 시제로 다양한 시험평가를 수행하였고, 2023년에 최종 한화 에어로스페이스의 레드백 장갑차를 사업 대상 체계로 선정하였다. 호주에서는 2024년 이후 최종적으로 육군에 배치할 예정이다.

호주의 지상전투 차량 체계(Land Combat Vehicle System) 사업 또한 한국의 국내구매 절차와 유사하게 시제를 제공받아 시험평가를 진행하고, 그 결과를 바탕으로 최종 업체를 선정하는 과정을 거친다. 그러나 미국의 획득 사례와 동일하게 시험평가를 위한 시제품 납품에 대해 업체와 별도의 계약을 체결한다는 점에서 국내구매 제도와 차이가 있다. 비록 계약의 상세 내용과 업체가 투자한 비용에 대한 구체적인 정보는 제한적이지만, 이러한 계약 방식은 정부가 시제품 제작과 시험평가 비용을 부담함으로써, 업체의 재정적 리스크를 줄이고 사업 참여를 촉진한다. 이는 한국 국내구매

6) Hanwha Defense to send prototypes of new armored vehicle to Australia, 연합뉴스 (2020. 7. 26.)

7) Rheinmetall signs Risk Mitigation Activity Contract for testing of Lynx KF41 for Australia's Land 400 Phase 3 program, <https://www.defence-and-security.com/> (검색일: 2024. 1. 25.)

일반적인 접근법과는 다른 점으로, 업체의 부담을 완화하고 보다 효율적인 사업 진행을 가능하게 한다.

글로벌 무기체계 구매사례의 시사점

미국과 호주의 무기체계 구매사례를 통해 확인할 수 있는 점은 크게 2가지로 볼 수 있다.

우선, 한국의 국내구매 제도상의 시제는 소요군에서 설정한 작전운용성능을 완벽하게 만족하는지를 확인하기 위한 시험 대상이라면, 두 국가의 시제는 실제 사용하는 군이 현장 또는 현장과 유사한 상황에서 사용하고 작전운용성능과 체계를 개선해나가기 위한 프로토타입 대상으로 보고 있다. 호주는 Risk Mitigation and Requirement Setting 단계에서 시제를 실제 운용 환경에서 무기체계의 기본 설계와 기능을 시험하는 데 사용하고, 필요에 따라 반복적인 개선과 시험을 수행하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 프로토타입이 실전 배치에 적합한지와 추가 개선이 필요 여부를 검토하고, 평가 결과를 바탕으로 개선사항을 반영하여 추가적인 시제를 개발하여 작전현장에서 실제 활용할 수 있도록 하고 있다. 미국의 MTA 절차 또한 필요에 따라 반복적인 개선을 업체에 요구하고 별도 시험을 추가로 수행하고 있으며, 실제 부대에서 시험사용을 하면서 사용자 요구사항 등을 반영하여 시제를 개선하는 과정을 거치고 있는 점에서 최초 제품을 개선해나가는 방향을 채택하고 있다.

우리나라도 국내 방위산업의 발전과 국내구매 제도 개선을 위해 군의 요구사항을 즉시 모두 충족하는 완성된 시제를 제공하는 것이 어렵다는 점을 인정하고 시험평가를 통해 개선하는 과정이 필요하다. 현재 우리나라는 설정된 작전운용성능을 만족하는 무기체계인지를 평가하는 것이 시험평가의 가장 큰 목적으로 수행되고 있다. 최근 빠르게 변화하는 기술을 적용하여 사용자의 편의와 무기체계의 효과도 증대를 위해서는 시험평가에서 프로토타입을 우선 제공하고, 작전운용성능에 대한 추가적인 검토와 개선을 통해 최종 제품을 개발하는 방식이 효과적일 수 있다. 이는 업체들에게 초기 단계에서 높은 비용 부담과 위험을 줄이면서도, 군의 실제 요구사항에 맞는 무기체계를 개발할 기회를 제공한다. 따라서, 국내구매 제도는 이러한 접근 방식을 적극적으로 고려하여 업체들이 기술적, 경제적 리스크를 관리하면서도 혁신적인 솔루션 제공을 지원할 수 있도록 개선될 필요가 있다.

유사한 현행 제도로써 신속시범사업이 있으나 국내구매 제도를 개선하는 것과는 근본적으로 차이가 있다. 신속시범사업은 첨단기술을 신속하게 국방분야에 적용하고 무기체계 획득기간을 단축하고자 도입하는 사업이다. 사업비용 500억 원 미만, 시제개발 소요기간이 2년 이내의 사업을 선정하여 국방신속획득기술연구원 주관으로 사업을 추진하게 된다. 다만, 신속시범사업의 절차는 제안, 연구개발, 시범운용, 소요결정, 양산/운용 순으로 이루어지게 되는데, 국내구매를 비롯한 다른 획득 제도가 소요결정으로부터 시작하는 것과 달리 신속시범사업은 기술로부터 소요를 창출한다는 차이점이 있다. 따라서, 소요가 결정된 무기체계는 연구개발이 필요한 체계가 아닌 경우 국내구매 제도를 통해 획득하는 것이 적절하며, 이런 측면에서 두 제도는 병행하며 보완, 발전되어야 한다.

두 번째는 두 국가 모두 시험평가 수행을 위한 시제를 납품받기 위해 계약을 체결한다는 점이다. 앞서 알아본 바와 같이 두 국가 모두 제안서 평가를 통과한 업체와 시험평가를 위한 시제 납품을 위한 계약을 체결하고 비용을 지불하였다. 그러나 우리나라의 경우 시험평가 비용에 대한 부담 주체에 대해 제도적인 설정이 되어 있지 않으며, 시험평가 수행비용과 시험평가 기간에 발생하는 보완사항 등의 수정을 위한 비용 전부를 업체에서 부담하고 있다. 이는 업체들이 구매보다는 연구개발 중심의 사업을 선호하게 만드는 주요 요인 중 하나이며, 회사 규모가 작은 중소기업의 경우는 기술적인 강점을 가진다고 해도 국내구매 사업에 참여할 수 없게 하는 요인이다. 따라서 국내 방위산업의 경쟁력 강화와 무기체계의 발전을 위해서는 시험평가 비용에 대한 제도적 보상 방안 마련이 시급하다.

결언

글로벌 무기체계 구매 사례 분석을 통해 얻은 시사점은 국내 방위산업의 발전 방향과 국내구매 제도의 개선에 중요한 기여를 할 수 있다. 미국과 호주 사례에서 보듯, 제도적 보상 방안과 효율적인 구매 절차는 국내 방위산업의 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 될 것이다. 앞으로 국내 방위산업이 더욱 발전하기 위해서는 이러한 국제적인 사례를 참고하여 현실적이고 실질적인 개선 방안을 모색해야 할 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2006호(9월 4일) 김성학·한준희, 합동경쟁개념에 대한 고찰
제2007호(9월11일) 김상백·이은아·변솔휘·정민지, 효율적 무인수송체계 적용 제언과 시사점
제2008호(9월25일) 김병주·최용호, 글로벌 무기체계 구매 사례와 국내구매 제도 개선을 위한 시사점
제2009호(9월27일) 서영보, 북한의 핵 위협 대응을 위한 현실적 방안에 대한 제언

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.
