

국방논단

제1981호(24-8) 2024년 2월 29일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

연구인프라보강사업 추진절차 개선방향

손순아 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
soona97@kida.re.kr

김연정 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
jungs1204@kida.re.kr

연구인프라보강사업은 국방과학연구소 첨단 무기체계, 기술개발과 군·산·학·연의 시험평가 지원에 요구되는 연구실험실, 시험시설/장비 확보 및 신규 시험장건설 등 국방연구개발 수행에 필수적인 국가 기간시설을 확보하는 사업을 말한다. '19년 감사원 기관 운영 감사 수검 시 총사업비 200억 원 이상 건축사업에 대해서 총사업비 관리가 필요하다는 지적을 받았고, 이후 '20년부터 진행 중인 다수의 연구인프라보강사업에 대한 최초 총사업비를 확정하고, 총사업비 관리대장에서 연구인프라보강 사업을 관리하고 있다.

연구인프라보강사업은 민간 분야의 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침에서 규정하는 사업추진절차를 많이 준용하였고, 국방연구개발에 필요한 시험시설, 시험장 건설이라는 사업적 특성으로 국방시설사업의 사업추진절차와 비교할 수 있다. 본고에서는 연구인프라보강사업의 사업추진절차를 살펴보고, 민간분야의 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」과 국방시설사업의 총사업비 관리절차와의 비교를 통해 연구인프라보강사업의 사업추진절차상의 개선방향에 대해서 제시하였다.

개선방향은 첫째, 시설·장비 사업계획서 작성 시 국가적 필요성, 국내외 구축현황 및 차별성, 시험시설 구성의 적정성 등 검토 항목의 보완이 필요하다. 둘째, 연구인프라보강사업 중 국방·군사 시설로 볼 수 있는 사업은 국방시설 관련 규정과 절차를 준용하여 시설사업기본계획을 마련할 필요가 있다. 셋째, 사업추진단계에서 총사업비 관리대상 사업은 전문기관의 사업분석, 선행연구 등의 전문분석을 사전에 수행하여야 한다.


연구인프라보강사업은 국방과학연구소의 첨단 무기체계, 기술개발과 군·산·학·연의 시험평가 지원에 요구되는 연구실험실, 시험시설/장비 확보 및 신규 시험장건설 등 국방연구개발 수행에 필수적인 국가 기간시설을 확보하는 사업을 말한다. 연구인프라보강사업은 국방과학연구소법 제5조 ①항의 재원으로 수행하며, 연구인프라보강사업으로 구축하는 연구시설·장비 사업은 방위사업훈령 「국방연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 규정」에 따라서 사업을 추진하고 있다. 본 규정에서 말하는 연구시설·장비란 국방연구개발을 위해 요구되는 연구시설과 연구장비를 총칭하고, 국방연구개발이란 '20년에 제정된 「국방과학기술 촉진법」 제8조에 의거 무기체계 연구개발, 미래도전국방기술 및 그 밖의 신기술을 활용한 연구개발 등이 해당된다. 또한 사업규모는 50억 원 이상 연구시설 및 3천만 원 이상의 연구장비를 대상으로 하며, 국방과학연구소 내부규정 「연구시설·장비의 관리 등에 관한 요령」에서 사업추진에 추가적으로 필요한 사항을 보완하여 제시하고 있다.

연구인프라보강사업은 '19년 이전에는 별도의 총사업비 관리를 하지 않았고, 필요시 총사업비를 증액하는 방식으로 사업이 추진되었다. 그러나 국방과학연구소는 '19년 감사원 기관 운영 감사수검 시 “총사업비 200억 원 이상 건축사업에 대해서 총사업비 관리가 필요하다”는 지적을 받았고, 이후 국방과학연구소는 '20년부터 진행 중인 다수의 연구인프라보강사업에 대한 최초 총사업비를 확정하고, 총사업비 관리대장에서 연구인프라보강사업을 관리하고 있다.

연구인프라보강사업은 민간 분야의 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침에서 규정하는 사업추진절차를 많이 준용하였고, 국방연구개발에 필요한 시험시설, 시험장 건설이라는 사업적 특성으로 국방시설사업의 사업추진절차와 비교할 수 있다. 본고에서는 연구인프라보강사업의 사업추진절차를 살펴보고, 민간분야의 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침과 국방시설사업의 총사업비 관리절차와의 비교를 통해 연구인프라보강사업의 사업추진절차 상의 개선방향에 대해서 제시하고자 한다.

연구인프라보강사업 사업추진절차

연구인프라보강사업의 추진 절차는 <그림 1>과 같이 「국방연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 규정」(방위사업청 훈령 제636호)에 따라 추진되고 있다.

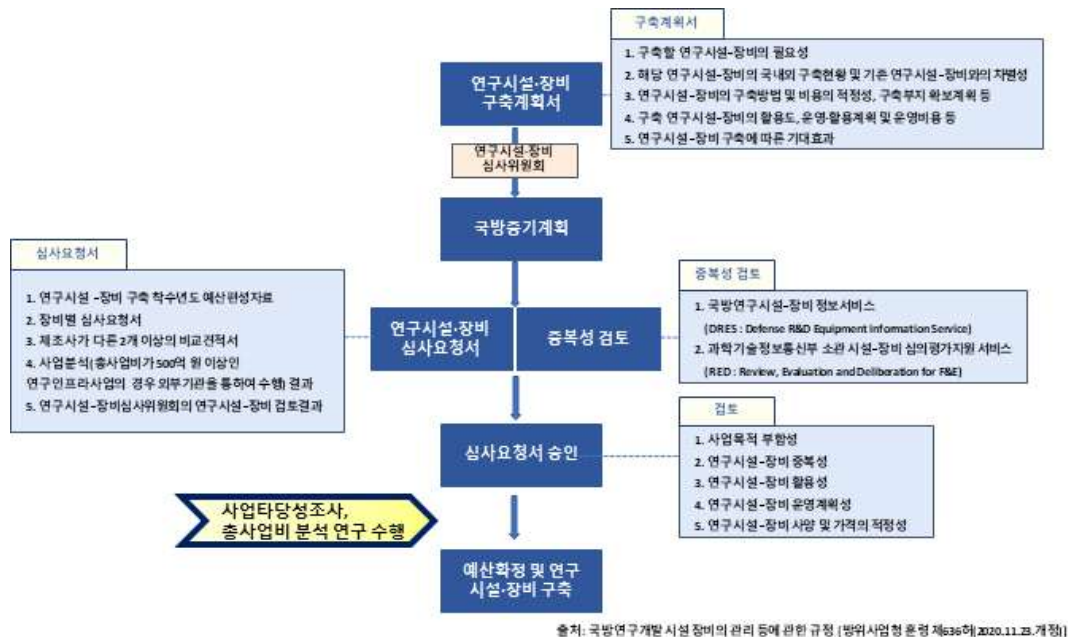

<그림 1> 연구인프라보강사업 사업추진절차

연구인프라보강사업은 국방과학연구소(출연기관)가 시설·장비 구축계획서를 최초로 작성한 후 자체 심의위원회를 운영하여 해당 계획서를 검토하는 것에서 시작한다. 구축계획서를 작성할 때는 다음과 같은 사전조사와 분석결과를 반영하여야 한다.

1. 구축할 연구시설·장비의 필요성
2. 해당 연구시설·장비의 국내외 구축현황 및 기존 연구시설·장비와의 차별성
3. 연구시설·장비의 구축방법 및 비용의 적정성, 구축부지 확보계획 등
4. 구축 연구시설·장비의 활용도, 운영·활용계획 및 운영비용 등
5. 연구시설·장비 구축에 따른 기대효과

국방과학연구소(출연기관)의 장은 구축계획서 검토 시에 3인 이상의 내부 및 외부 전문가를 위원으로 하는 자체 연구시설·장비심사위원회를 구성하여 운영해야 한다.

다음으로 국방과학연구소(출연기관)의 장은 사업 착수시점이 포함되는 국방중기계획 요구 시 최초 작성된 구축계획서를 포함하여 국방중기계획 작성자료를 방사청(감독기관)에 제출한다. 이후 시설·장비 구축 착수년도 예산편성 요구 시 사업에 대한 심사요청서를 포함하여 방사청(감독기관)에 관련 자료를 제출하여야 한다. 심사요청서 제출 시에는 장비별 심사요청서, 제조사가 다른 2개 이상의 비교견적서, 사업분석(총사업비 500억 원 이상인 연구인프라사업의 경우 외부기관을 통하여 수행) 결과 및 자체 연구시설·장비심사위원회의 연구시설·장비검토결과 등을 포함하여 제출한다. 심사요청서에 포함될 항목은 아래와 같다.

- | | |
|---------------|------------------------|
| • 사업목적 부합성 | • 연구시설·장비 운영계획성 |
| • 연구시설·장비 중복성 | • 연구시설·장비 사양 및 가격의 적정성 |
| • 연구시설·장비 활용성 | |

최종적으로 방사청(감독기관)에서 사업계획서(심사요청서가 포함된 예산편성자료)를 검토하면, 사업승인이 완료되고, 예산 확정 및 시설·장비 구축을 진행한다.

국가연구개발 시설·장비 사업추진절차

연구개발시설·장비는 연구개발활동에 직접적으로 사용되며 연구개발에 필요한 기능과 환경을 구현하는 시설 및 장비를 말한다. 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」(과학기술정보통신부고시 제2021-92호)¹⁾에서 연구개발 시설·장비의 도입·관리·운영·공동활용 및 처분과 연구시설·장비종합정보시스템의 구축 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있다.

본 지침의 적용대상은 국가연구개발사업으로 구축비용 3천만 원 이상의 연구시설장비이며, 구축비용 5억 원 이상인 연구시설장비는 연구기관 차원의 사전기획보고서 작성을 통한 구축 타당성

1) 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」(과학기술정보통신부고시 제2021-92호, 2021. 12. 15.). 「과학기술기초법」 및 동법 시행령에서 위임된 연구개발 시설·장비의 도입·관리·운영·공동활용 및 처분과 연구시설·장비종합정보시스템의 구축 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정

의 검토대상이 되고, 500억 원 이상인 연구시설장비는 예비타당성조사 실시 대상이 된다.

민간분야 국가연구개발 시설·장비 도입 추진 절차는 <그림 2>와 같이 기획-심의-구축-등록-운영-활용-폐기 순으로 진행된다.



<그림 2> 민간분야 국가연구개발 시설·장비 도입 추진 절차

연구시설장비 기획단계에서 연구시설장비를 도입하고자 하는 연구기관의 장은 연구시설장비에 대한 대내·외 여건 및 역량을 분석하고, 연구시설장비의 수요 조사를 실시하여 중기구축계획을 수립한다. 구축계획을 수립하는 경우 ZEUS²⁾를 통하여 중복성 검토를 실시하여 중복 구축여부를 사전에 검토하여야 한다. 이후 중기구축계획에 포함된 연구시설장비에 대한 중복성 검토를 실시하고, 사업별 예산 및 연구개발 방향을 고려하여 구축대상 연구시설장비를 확정할 수 있다. 특히 연구기관의 장은 구축비용 5억 원 이상 소요될 것으로 예상되는 연구시설장비의 도입을 추진할 때는 예산요구 이전에 구축타당성에 대한 사전기획을 실시해야 한다. 사전 기획보고서에는 다음의 사항이 필수적으로 포함되어야 한다.

2) ZEUS: Zone for Equipment Utilization Service System, 연구시설·장비종합정보시스템

필요성: 사업(연구)목적과의 부합성, **국가적 필요성(장기계획과의 연계성)**
 중복성: **국내외 구축현황 및 차별성**
 적정성: 연구목적 달성을 위해 적합한 구성 및 성능과 **비용 적정성**
 활용성: 동 사업 활용계획 및 타 사업 활용성
 파급성: 기대효과 및 파급효과

<표 1> 민간분야 사전기획보고서와 연구인프라보강사업 사업계획서 비교

구분	민간분야 사전기획보고서		연구인프라보강사업 사업계획서
검 토 항 목	필요성	사업(연구)목적과의 부합성	사업목적 부합성
		국가적 필요성(장기계획과의 연계성)	
	중복성	국내외 구축현황 및 차별성	연구시설·장비 중복성
	적정성	연구목적 달성을 위해 적합한 구성 및 성능 과 비용 적정성	연구시설·장비 사양 및 가격의 적정성
	활용성	동 사업 활용계획 및 타 사업 활용성	연구시설·장비 활용성 연구시설·장비 운영계획성
	파급성	기대효과 및 파급효과	


국방의 연구인프라보강사업은 민간분야 지침을 많이 준용하였지만, 실제 기획보고서 수준에서 비교하면 큰 항목에서는 차이는 없지만, 필요성, 중복성, 적정성 측면에서 모두 다소 간소한 내용으로 기술되어 있다. 특히나, 사업타당성 조사와 같은 분석평가 단계에서 필요성 분야 중 국가적 필요성 장기계획과의 연계성 등은 필수적인 검토항목이 될 수 있다. 또한 신규사업의 경우는 국내외 시설과 중복성이 없는지 민간분야를 포함한 기존시설과의 차별성이 꼼꼼히 제시되어야 한다. 즉, 국방 연구인프라보강사업은 총사업비관리대상에 해당될 경우 사업타당성조사와 같은 분석평가를 제대로 통과하기 위해서는 민간분야 지침을 보다 준용하여 사업의 필요성, 중복성 등 각각의 항목별 사전검토사항에 대한 보완이 필요하다.

국방시설 사업추진 절차

국방·군사시설이란 군사작전, 전투준비, 교육, 훈련, 병영생활 등에 필요한 시설, 국방·군사에 관한 연구 및 시험시설, 군용 유류 및 폭발물의 저장·처리 시설, 진지 구축시설, 군사목적을 위한 장애물 또는 폭발물에 관한 시설, 그 밖에 군부대에 부속된 시설로 군인의 주거 복지 체육 또는 휴양 등을 위하여 필요한 시설로 법률³⁾에서 정하고 있다. 국방·군사시설 사업이란 해당 시설의

설치·이전 및 변경에 관한 사업 등을 의미한다.

국방 시설사업은 '91년 국방·군사시설사업의 원활한 사업수행을 위해 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」(약칭 국방시설사업법)이 제정되었고, 이후 '13년에 「국방부 시설·정보화사업 총사업비 관리훈령」(국방부 훈령 제2533호)⁴⁾을 제정하여 국방부 시설·정보화사업의 총사업비를 조정·관리하고 있다. 대부분의 국방 시설사업은 「국방부 시설·정보화사업 총사업비 관리훈령」 및 「군 시설사업 관리훈령」⁵⁾에 따라 진행된다.



<그림 3> 일반시설사업 진행절차

일반적인 시설사업 진행절차는 <그림 3>과 같이 무기체계 획득의 일반적인 소요절차와 유사하다. 소요군에서 소요를 제기한 후 중기계획이 수립되고, 이후 예산편성과 집행계획이 확정되면 설계가 진행된다. 마지막으로 공사계약/집행/관리 및 유지가 이루어진다. 실시설계 이전 단계까지는 개략 공사비가 산출되고, 설계가 구체화되는 과정에서 사업내용 및 필요한 예산이 구체화된다.

소요제기 단계에서 소요제기기관은 「국방개혁기본계획」 또는 「부대개편계획」과 같은 확정된 계획을 근거로 소요를 제기한다. 중기계획 수립단계에서는 「국방·군사시설발전계획」을 기반으로 시설사업 중기계획이 수립되며 중기 대상 기간의 마지막 년도(X+6년)에 반영하는 것을 원칙으로 한다. 특히 「국방부 시설·정보화사업 총사업비 관리훈령」에 해당하는 사업의 경우 중기계획 반영 요구 시 또는 예산편성 이전에 타당성 조사 및 검토 등이 실시되어야 한다. 예산편성단계에서는 소요제기기관은 「국방예산(안)편성지침」에 따라 예산요구서를 작성하여 국방부 사업국 및 계획예산관실에 제출한다. 대형사업의 경우 기본계획을 작성하고, 부지 매입, 각종 협의, 설계, 공사 등의

3) 「국방·군사시설사업에 관한 법률」 제2조

4) 「국방부 시설·정보화사업 총사업비 관리훈령」(국방부 훈령 제2533호, 2021. 3. 5.)

「국가재정법」 및 같은법 시행령, 「총사업비관리지침」, 「국방사업 총사업비 관리지침」(기획재정부)에 따라 국방부 시설·정보화사업의 총사업비를 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 제고함을 목적으로 함

5) 「군 시설사업 관리훈령」(국방부 훈령 제2613호, 2021. 12. 31.)

군 시설사업을 체계적·효율적으로 시행하고 군 시설을 안전하게 유지·관리하기 위하여 국방부 본부, 시설사업 집행기관, 시설사업 소요제기기관 간의 임무분장과 사업절차 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

단계별 소요기간을 고려하여 사업기간에 대한 계획도 마련해야 한다. 패키지시설의 경우 사업추진기본전략(안) 수립 시 시설사업 기본계획을 포함하여 수립해야 한다. 여기서 말하는 국방 시설사업 기본계획이란 선행연구를 통해 사업내용, 예산, 일정 등 사업추진 계획을 수립하는 것이다. 집행계획 확정 및 설계단계를 거쳐 공사계약 체결 및 관리 순으로 이루어진다.

앞서 살펴본 바와 같이 시설사업은 예산편성시 대형사업의 경우 기본계획을 수립하도록 하고 있다. 200억 원 이상의 건축사업 등 총사업비관리대상의 경우라면 이에 해당한다고 볼 수 있다. 시설사업 기본계획에 포함되는 사항은 다음과 같다.

1. 「건설기술진흥법 시행령」 제69조에 따른 ‘건설공사기본계획’에 포함할 내용
2. 시설규모 및 면적, 요구조건의 적정성 검토결과
3. 공사예정지와 해당부대의 공사 여건 분석결과
4. 대관협의 필요사항에 대한 조치계획
5. 사업에 포함된 장비, 물자, 방호시설 등의 확보방안
6. 사업추진단계별 기간을 구분한 사업추진일정 (대관협의 및 계약행정 일정 등 포함)
7. 사업추진 간 발생할 수 있는 예상 문제점 및 조치방안
8. 제1호부터 제7호까지의 사항을 종합한 총사업비 예측(총사업비 내 사업추진 가능 여부 검토 포함)
9. 방위사업청, 소요군, 집행기관 포함 통합사업관리팀 구성(안)
10. 수립된 시설사업 기본계획(안)에 대한 소요군 및 시설사업 집행기관의 의견

특히, 건설공사 기본계획은 소요기획단계의 최종산물로 설계단계로 진행되어 사업이 구체화되기 위한 ‘사업추진기본전략’이다. 시설사업에 대한 기본구상, 사전 조사를 수행하여 사업내용, 사업예산(설계, 시공, 유지관리 등), 사업일정(설계, 시공 등 단계별 일정), 비용 등을 합리적으로 수립하는 계획이다. 따라서, 시설분야 연구인프라보강사업이 분석평가 대상이 되는 경우는 예산편성 이전에 시설사업의 사업추진전략에 해당되는 시설공사기본계획을 수립하여 사업타당성조사 등의 분석 시 해당 계획이 검토될 수 있어야 한다.

연구인프라보강사업 사업추진절차 개선 방향

연구인프라보강 사업은 '20년부터 총사업비 관리대상이 되었기 때문에 현재까지 최초 총사업비 확정을 위한 분석평가(사업타당성조사, 총사업비분석)를 2건 수행하였다. 향후 연구인프라보

강사업에 대한 총사업비 관리는 더욱 강화될 것으로 보이며, 최초 총사업비 확정을 위한 분석평가의 수행도 많아질 것으로 예상된다. 이러한 상황에서 2개 사업에 대한 분석평가 수행 과정 중 식별되었던 점들을 바탕으로 연구인프라보강사업 추진절차의 개선 방향을 제시하고자 한다.

첫째, 시설·장비 사업계획서 작성 시 검토 항목의 보완이 필요하다. 연구인프라보강사업의 많은 부분이 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」을 준용하였다. <표 1>에서는 보는 것과 같이 연구인프라보강사업의 사업계획서 검토 항목은 민간분야 사전기획보고서의 일부만 반영되어 있는데, 현재 미반영 및 보완이 필요한 항목을 사업계획서에 포함하는 것이 필요하다.

연구인프라보강사업의 사업계획서에서도 필요성 항목을 다루기는 하지만, 사업목적의 부합성에 중점을 둔다. 민간분야 사전기획보고서와 마찬가지로 국가적 필요성(장기계획과의 연계성)에 대한 검토 항목을 추가하는 것이 필요하다. 예를 들어 국방과학기술혁신 기본계획에서 제시한 전략기술분야를 검토하고 이와 관련이 있다면, 해당 시설 및 장비 사업 또한 국방 정책적으로 필요성이 있다고 볼 수 있다. 따라서 신규 연구개발시설·장비를 확보하는 데 있어서 국가적인 필요성을 추가하여 서술함으로써 필요성을 보강할 수 있다. 추가적으로 국방분야에서 장기계획과의 연계성은 해당시설과 관련 무기체계와의 연계성 측면에서도 살펴볼 수 있다. 향후 개발될 무기체계 또는 기술의 로드맵이 명확히 제시된다면 무기체계와 연계된 시험시설 등의 사업 필요성 측면에서 근거가 마련될 것이다. 연구인프라보강사업으로 추진되는 국과연 시험시설은 무기체계 소요가 결정된 사업의 경우 해당 무기체계사업의 장기계획을 고려하면 근거가 명확하다. 반면에 무기체계 소요가 명확하지 않은 경우는 연구개발과 관련된 기술기획문서 등을 면밀히 조사하여 장기계획과의 연계성을 살펴볼 필요가 있다.

중복성 항목에서도 국내외 구축현황 및 차별성 항목에 대한 보완이 필요하다. 신규 연구개발 시설·장비는 해당 시점에서 국가전략기술과 관련되며 해당 기술은 국방뿐 아니라 민간에서도 활발하게 진행되는 경우가 많다. 따라서 중복성 항목에서 국내외 구축현황을 기술하고, 기구축된 시설·장비라면 어떠한 차별성이 있는지에 대한 설명이 필요하다. 또한 대부분이 연구인프라보강 사업으로 추진되는 시험장 및 연구시설은 제한된 방식으로 기존시설을 활용하고 있는 경우가 많다. 이러한 경우 기존시설의 제한사항들이 자세히 분석되어야 신규 시설의 필요성에 대한 근거가 마련될 수 있다.

마지막으로 적정성 항목에서는 해당 연구시설·장비 구축 목적을 달성하는데 적합한 구성으로 되어 있는지에 대한 검토가 필요하다. 특히 기초연구 수준의 연구시설은 시설면적에 대한 적절한 기준을 마련하는 것이 제한된다. 대신에 현재 국방시설기준으로 연구시설이 구성되는 시험시설의 시험공정이나 단계별 시험실 구성이 적절한지 살펴볼 수 있다. 이런 측면에서 제한적이지만 시험시설의 구성의 적정성 등이 제시된다면, 시설 면적의 적정성이 일부 보완될 수 있다.

둘째, 연구인프라보강사업 중 국방·군사에 관한 연구 및 시험시설은 국방·군사시설로 볼 수 있고, 따라서 국방시설 관련 규정과 절차를 준용할 필요가 있다. 대형 시설사업을 추진할 경우는 무엇보다 예산편성 이전 계획수립 단계에서 시설사업기본계획 마련이 중요하다. 총사업비관리대상에 해당 될 경우는 기계획의 수립을 전제로 해당 계획의 적절성과 계획에 근거한 비용의 적정성에 대한 검토가 이루어진다. 따라서, 연구인프라보강사업의 경우 특히, 장비가 아닌 시설에 해당 되는 경우라면 총사업비 확정을 위한 예산편성요구 이전에 시설사업기본계획을 마련해야 한다. 시설사업기본계획의 기본 요건은 앞서 기술한 내용처럼 시설사업 추진을 위한 전략을 제시하는 것이다. 시설사업에 대한 기본구상, 사전 조사를 통해 사업내용, 사업예산(설계, 시공, 유지관리 등), 사업일정(설계, 시공 등 단계별 일정), 비용 등이 합리적으로 제시되어야 한다. 총사업비관리 대상 사업은 한 번의 분석으로 끝나지 않고, 사업이 구체화될수록 비용증감이 발생하는 경우가 많다. 따라서 기본계획수립을 토대로 설계가 구체화되는 과정에서 변동요소가 발생하더라도 현재 계획 및 기준이 명확히 제시되어야, 향후 변동사유가 발생시에도 조정요구 및 분석내용을 논리적으로 비교 검토 가능할 것이다.

셋째, 사업추진단계에서 총사업비 관리대상 사업은 전문기관의 사업분석, 선행연구 등의 전문 분석을 사전에 수행하여야 한다. 앞서 제시한 두 가지 개선사항을 마련하기 위해서는 자체계획서 마련으로는 한계점이 있다. 연구인프라보강사업의 기본적인 관련 규정에 따라 사업수행절차는 진행하되, 총사업비관리대상의 경우는(200억 원 이상 건축사업) 전문기관의 선행연구를 거쳐 사업계획과 비용에 대한 면밀한 세부검토가 수행되어야 한다.

국방시설사업은 예산편성 이전에 사업타당성 조사, 사전타당성 검토를 위한 선행연구 등 전문기관의 분석평가를 수행한다. 선행연구를 통해 사업 필요성 및 계획의 적절성 검토 등 사업계획이 미흡할 경우 이를 보완하여 사업을 추진할 수 있는 장치를 마련하고 있다. 그러나 현재 진행하고 있는 연구인프라보강사업은 최초 총사업비 확정 단계에서 사전연구가 미흡한 채 사업타당성 조사

및 총사업비분석과 같은 분석평가를 진행함에 따라 선행연구 등의 전문분석 수준으로 연구가 진행되고 있다. 최초 총사업비 확정단계에서 사업계획이 미흡하다고 나올 경우, 사업계획 재검토 등의 수정·보완 조치기간이 필요하고 사업기간이 순연되는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 예산 편성 이전 또는 중기계획 반영 전후로 전문분석을 사전에 수행함으로써 사업기간 순연 등의 사업 추진 위험을 최소화하는 것이 필요하다. 특히, 500억 원 이하의 사업타당성 조사 제외 대상 사업의 경우에도 총사업비 관리대상에 해당되는 경우라면 전문용역 기관에 사전연구를 수행토록 하여 사업추진 및 예산 낭비 없이 효율적인 사업추진이 가능할 것이다.

맺음말

본고에서는 국방과학연구소에서 추진하고 있는 연구인프라보강사업 추진 시 개선사항들에 대해서 살펴보았다. 국가연구개발사업과 국방시설사업과의 유사성 측면에서 각각의 계획수립 시 기본 요건들을 살펴보고, 비교 검토함으로써 연구인프라보강사업의 문제점과 개선사항들을 구체적으로 제시하였다.

연구인프라보강사업은 국방 무기체계사업과의 장기로드맵을 고려하여 연구인프라보강사업의 필요성이 명확히 제시되어야 하며, 국가예산의 중복 투자를 방지하기 위해 민간시설 및 기존 시설과의 중복성이 없는지도 분석되어야 한다. 다음으로 연구인프라보강사업이 시설분야인 경우 시설 사업추진을 위한 사업내용, 예산, 일정 등의 사업추진계획에 해당되는 시설사업 기본계획이 수립되어야 한다. 끝으로 앞선 두 가지 개선사항을 반영하기 위해서는 전문기관에 사전연구를 통해 사업의 필요성, 계획의 적정성, 예산의 적정성 등이 면밀히 분석되어야 효율적인 사업추진이 가능하다고 보았다.

국방부는 최근 '23년 5월 국방과학기술혁신 기본계획을 확정하고 국방과학기술혁신을 위한 예산/인력 인프라 구축을 단계적으로 확대 추진할 것을 제시하였다. 국방과학연구소는 연구인프라보강사업을 통해서 국방연구개발 추진을 위한 연구인프라보강사업을 더욱 확대할 가능성이 높다. 본고에서 제시한 개선사항들이 반영되어 연구인프라보강사업의 효율적인 사업추진 및 총사업비 관리가 이루어짐으로써, 국가 재정지출의 효율성이 제고될 수 있기를 기대한다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 제1979호(2월14일) | 임재혁·최인수, 미군의 암호 발전 동향과 시사점 |
| 제1980호(2월19일) | 두진호·송지은, 우크라이나 전쟁 전훈 분석 |
| 제1981호(2월29일) | 손순아·김연정, 연구인프라보강사업 추진절차 개선방향 |
| 제1982호(3월 8일) | 정재웅, NATO 규정을 통해 본 지하형탄약고 구조 개선방향 |
