

국방논단

제1974호(24-1) 2024년 1월 5일

발행처 한국국방연구원

발행인 김윤택

편집인 이재욱

국방 전력운영사업 사전타당성 검토 발전방향

홍석수 | 한국국방연구원 국방자원연구센터

sshong@kida.re.kr

이현재 | 한국국방연구원 국방자원연구센터

milletmillet@kida.re.kr

김리아 | 한국국방연구원 국방자원연구센터

rheakim@kida.re.kr

국방 전력운영사업 사전타당성 검토 제도는 해당 분야의 총사업비 300억 원 이상 신규 사업(단, 건축사업은 총사업비 200억 원 이상)에 대한 타당성을 사전에 객관적이고 합리적으로 조사·평가·검토함으로써 재정운영의 효율성을 제고하기 위한 목적으로 수행되고 있다. 예비타당성조사와 동일한 역할을 하고 있으며 2013년에 제도가 시행된 이후로 약 5천억 원 이상의 예산을 절감할 수 있는 결과를 도출하였다. 하지만 달라진 국가재정여건 및 재정혁신 기조하에서 역할을 온전히 수행하기 위해서는 지속적인 제도 개선 및 발전의 노력이 필요하다. 본고에서는 지난 2022년 발표된 예비타당성조사 개편 내용을 토대로 사전타당성 검토의 발전방향을 고찰하였다.

첫 번째로, 건축사업에 한해서 총사업비 200억 원 이상인 대상사업 기준금액을 300억 원으로 상향 조정하는 것이다. 2019년 이후 급격히 상승한 건축공사비의 영향으로 사전타당성 검토의 수요가 증가할 가능성이 높으며 이는 한정된 제도 운영 및 연구수행능력 범위 내에서 부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 두 번째, 예비타당성조사 개편내용과 마찬가지로 사전타당성 검토 제도에서도 사업계획 적정성 검토의 활용을 고려할 필요가 있다. 사전타당성 검토 수행 건수를 조절하여 그 대신 사업계획 적정성 검토를 수행함으로써 증가할 수 있는 수요 또는 200~300억 원 미만의 사업들에 대한 대응이 보다 용이해질 것으로 판단된다. 마지막으로 가장 근본적이면서도 중요한, KIDA 수행지침의 지속적인 개선 및 고도화가 필요하다. 2023년 수립한 “국방시설사업 분석평가 수행지침”을 지속적으로 최신화하고 개선하여 변화하는 제도 및 환경, 여건의 변화를 충실하고 정확하게 반영함으로써 합리적이고 신뢰성 있는 연구결과를 도출해야 할 것이다.

정부는 “2023~2027 국가재정운용계획”에서 재정운용의 기본방향으로 크게 세 가지를 제시하였다.¹⁾ 첫 번째, 재정의 지속가능성 제고를 위해 건전재정기조를 견지한다는 것이다. 두 번째, 이와 동시에 약자 복지 강화, 미래 준비 투자, 양질의 일자리 창출, 국가의 본질적 기능 수행 뒷받침 등 4대 중점 분야에 과감히 투자한다는 것이다. 세 번째로는 강력한 지출 재구조화 및 재정혁신을 지속적으로 추진한다고 밝혔다.

국방부는 지난 2022년 12월 말 발표한 “2023~2027 국방중기계획”에서 주요 국방과제 및 “국방혁신 4.0”의 원활한 이행과 더불어 ‘튼튼한 국방, 과학기술 강군, 따뜻한 병영’을 목표로 5년간 331조 4,000억 원을 투입할 것이라고 밝힌 바 있다. 특히, 최근의 엄중한 안보 상황을 고려하여 군사력 건설을 위한 방위력 개선비에 재원을 우선적으로 배분하였고 전력운영비에서는 간부 및 장병의 복무여건 개선, AI 과학기술 강군 육성에 중점을 두었다.²⁾ 그러나 현재의 재정상황과 정부의 재정혁신 기조하에서 국방중기계획상의 소요재원을 충분히 확보하는 것은 불확실성이 큰 상황이며 국방부 내에서도 예산 효율화를 위한 노력이 필요하다. 더욱이 병 봉급 인상과 복무여건 개선을 위한 예산 증가가 불가피한 상황에서 전력유지비에 해당하는 사업예산의 효율적인 집행은 그 중요성이 매우 높다.

한국국방연구원(이하 KIDA)에서는 2013년부터 국방 전력운영사업 사전타당성 검토 제도를 운영하고 있다. 한국개발연구원과 한국조세재정연구원에서 수행하고 있는 예비타당성조사(이하 예타)와 유사한 제도로써 국방 전력운영 분야의 총사업비 300억 원 이상 신규 사업(단, 건축사업은 총사업비 200억 원 이상)에 대한 타당성을 사전에 객관적이고 합리적으로 조사·평가·검토함으로써 중기계획 수립 또는 예산편성 시 재정운영의 효율성을 제고하기 위한 목적으로 수행되고 있다. 한편, 예타는 1999년부터 시행된 제도로써 정부 재정이 대규모로 투입되는 사업의 정책적·경제적 타당성을 사전에 검증·평가하여 예산이 보다 효율적으로 집행될 수 있도록 하는 역할을 하고 있다. 또한 정부 및 관련 기관에서는 사회와 수행 여건의 변화에 발맞춰 지속적으로 제도를 개편, 발전시키고 있다.

본고에서는 사전타당성 검토 제도가 시행된 지 10년이 지난 시점에서 2022년 발표된 예타 제도의 개편내용을 토대로 앞으로의 제도 발전방향을 고찰해보았다. 이에 앞서 사전타당성 검토에

1) 기획재정부. (2023. 8.). “2023~2027년 국가재정운용계획 주요내용.”

2) 국방부. (2022. 12.). “「2023~2027 국방중기계획」 향후 5년간 331조 4천 억 투입.” 보도자료.

대한 간략한 소개와 함께 그간의 제도 변화에 대해 서술하였고 성과에 대해서도 정리하였다. 그 다음, 예타 제도의 개편내용을 살펴보고 주요 착안점을 토대로 사전타당성 검토의 향후 발전방향을 제시하였다.

사전타당성 검토 제도 개요

국방 분야에서 예타와 같은 역할을 하는 제도는 두 가지가 있는데 사업타당성조사와 사전타당성 검토이다. 예타를 포함하여 이 세 가지 제도를 비교해보면 다음의 <표 1>과 같다.

<표 1> 예비타당성조사, 사업타당성조사와 사전타당성 검토 비교

구분	예비타당성조사	사업타당성조사	사전타당성 검토
주관 부처	기획재정부	기획재정부	국방부
대상 사업	총사업비 500억 원 이상, 국가 재정지원이 300억 원 이상인 신규 사업	총사업비 500억 원 이상인 국방 분야 신규 사업	총사업비 300억 원 이상 500억 원 미만인 전력운영 분야 신규 사업(건축 사업은 200억 원 이상)
조사 기관	한국개발연구원, 한국조세재정연구원	한국국방연구원, 한국과학기술기획평가원	한국국방연구원
법적 근거	국가재정법	방위사업법	—
세부 근거	기획재정부, 예비타당성조사 운용지침	기획재정부, 국방사업 총사업비 관리지침	국방부, 국방 전력운영사업 사전타당성 검토 및 심층평가 운용지침
도입 연도	1999년	2011년	2013년

<표 1>에서 확인할 수 있듯이 사전타당성 검토는 국가 법에 명시되어 있지 않지만 국가재정법에 근거하여 제정한 국방부 자체 훈령과 지침에 근거를 두고 있다.³⁾ 이는 사업타당성조사 대상에서는 제외되지만 기획재정부의 총사업비 관리대상사업에는 해당하는 200억 원 이상 500억 원 미만의 사업에 대해서도 자체적으로 관리를 강화한 것으로 전체 정부 부처 중에서도 이와 유사한 자체 타당성조사를 실시하고 있는 곳은 많지 않다.⁴⁾ 국방부는 10년 전부터 사전타당성 검토 제도

3) 「국방기획관리기본훈령」(제2627호, '22. 2. 3.), 「국방부 시설·정보화사업 총사업비 관리훈령」(제2533호, '21. 3. 5.), 「국방 전력운영사업 사전타당성 검토 및 심층평가 운용지침」(국방부지시 제2023-17호, '23. 7. 6.)

를 실시해오면서 효율적인 예산 집행을 위해 노력하고 있다.

사전타당성 검토의 대상인 전력운영 분야는 전체 국방 분야 중에서 방위력개선, 즉 무기체계 획득과 관련된 사업 이외의 모든 분야를 포함하며 군수, 시설, 인력, 정보화사업 등으로 구성된다. 실제 사전타당성 검토를 수행한 사례를 토대로 살펴보면 전력운영 분야 중에서도 시설 사업이 대부분을 차지하고 있으며 그 외에는 교육훈련장비 획득사업에 대해 수행한 사례가 일부 존재한다. 이는 전력운영 분야의 사업들이 과거부터 계속 진행되어온 경우가 많고 신규 사업은 특정 분야(시설 사업)에 집중되어 있는 특징에 기인한 것으로 판단된다.

그간의 제도 운영현황 및 성과

KIDA 수행지침

사전타당성 검토가 도입된 2013년 이후 연구결과의 신뢰성과 객관성을 제고하고 연구자의 업무 효율성을 위해 KIDA에서는 사전타당성 검토 및 심층평가의 구체적 수행지침을 마련해 활용하고 있다. 2016년에 수행한 “전력운영 분석평가사업 수행체계 발전방안 연구”를 통하여 국방 부문의 분석평가 특징을 식별하고, 이를 기반으로 대상사업 유형 분류에 따른 분석기준 설정과 표준적인 업무절차를 마련하였다. 또한, 객관적이고 합리적인 분석평가 수행을 위해 정형적인 평가요소를 식별하고 구체적인 평가방법을 정립하였으며, 기존 분석사례를 제시함으로써 연구자의 이해가 용이하도록 하였다. 2023년에는 사업타당성조사와 사전타당성 검토를 포괄하여 국방시설사업 분석평가의 구체적인 절차와 비용추정 방법론 등을 정립한 연구를 수행하여 시설사업의 특징을 고려한 수행지침을 마련하였다. 그 내용 중 비용추정 단계는 연구결과의 일관성 유지를 위해 매년 반기별로 방법론 자료를 최신화하여 공유함으로써 실제 연구 수행 시 참고할 수 있도록 하였다. 이러한 지침을 지속적으로 개발한 것은 국방 분야의 특성을 반영한 분석평가 기준이나 방법론을 발전시키는 계기가 되었다.

4) 국방부를 제외하면 국토교통부에서 수행하는 “공공교통시설 타당성 평가” 제도가 있다. 총사업비 300억 원 이상의 공공교통시설 개발사업을 대상으로 한다.

제도적 변화

본절에서는 사전타당성 검토 관련 법령인 「국방부 시설·정보화사업 총사업비 관리 훈령」, 「국방 전력운영사업 사전타당성 검토 및 심층평가 운영지침」을 위주로 사전타당성 검토의 제도적 변화에 대해 살펴보도록 하겠다.

먼저 대상사업 요건은 앞서 언급한 운영지침에 따라 기본적으로 총사업비가 300억 원 이상인 신규 사업이며 예외적으로 건축사업은 총사업비 200억 원 이상 사업을 포함한다. 이 요건은 제도 도입 당시와 동일하게 유지되고 있다. 사전타당성 검토기간은 제도 시행 초기에 지침상 4개월을 원칙으로 하되 대상사업의 성격 등을 고려하여 조사 수행기간을 따로 정할 수 있도록 하였으나 실제로 소요된 수행기간 및 연구여건 등을 토대로 검토하여 6개월로 현실화시켰다. 현재까지 수행 완료한 전체 사전타당성 검토 연구의 약 90%는 6개월 이내에 종료되었다.⁵⁾

그리고 면제사업 요건을 구체화하여 무분별한 면제 시도를 사전에 방지하고자 하였다. ‘선행연구를 실시한 사업’이 면제 요건 중 하나였으나 이를 삭제하였으며 동종의 사업 추진 실적이 있고 추진 내용 및 절차가 정형화되어 사전타당성 검토의 실익이 없는 사업과 같이 면제사업의 요건을 명시하였다. 대상사업 선정시기에 대한 부분도 지침에 명확한 언급이 없어 수시로 대상사업을 선정했었으나 이를 정례화하여 사업계획 준비 등의 체계적 사업관리를 도모하였다. 그에 따라 사전타당성 검토는 현재 4월 말과 9월 말, 연간 2회 대상사업을 선정하고 있다. 또한, 대부분의 경우 경제적인 수익이 발생하지 않는 국방사업의 특성에 맞게 검토를 수행하기 위하여 단서조항을 추가하였다. 즉, 편익에 대한 분석이 가능한 사업에 대해서만 조건부로 검토를 수행하도록 지침을 개정하였다.

수행 실적 및 성과

사전타당성 검토는 2023년 9월 현재, 총 31건의 사업에 대해 수행 완료하였고 현재 1건이 진행 중으로, 매년 약 3건 이상 수행하였다. 사전타당성 검토를 수행한 사업은 주로 건축사업과 부대이전·개편인 부대조성 사업으로 분류되고, 건축사업은 보건복지시설, 작전지휘시설, 주거시설, 저장

5) 나머지 연구는 대부분 별도의 위탁용역을 활용하여 7개월 기간 내에 수행한 바 있으며 예외적으로 사업계획이 전면 변경되어 10개월이 소요된 사례가 있었음.

정비시설 등으로 다양하다. 전체 총사업비 규모는 약 1조 6,628억 원이었는데, 사전타당성 검토에서 타당성 미확보로 도출된 사업의 총사업비를 예산 절감액으로 보면 945억 원의 예산 절감 성과가 있었다. 이는 전체 검토대상 총사업비의 약 6% 정도에 해당한다. 2013년부터 현재까지 사전타당성 검토를 통해 절감한 예산은 약 4,518억 원으로 이는 전체 검토대상 총사업비의 약 27.2%에 해당한다.

예비타당성조사 제도 개편의 주요 내용⁶⁾

2022년 9월 13일, 정부는 최근의 경제 및 사회적 변화를 고려하여 “예타 제도 개편 방안”을 발표했다. 기획재정부는 예타 제도가 대규모 재정사업의 타당성을 객관적으로 검증하며 재정 효율성을 향상시켰지만, 평가의 획일성, 조사 지연 및 조사절차의 경직성, 예타 면제 건수 증가 등의 문제점으로 인해 급변 개편을 결정하였음을 밝혔다. 개편방안의 중점 추진부문은 크게 세 가지로, ▲예타 제도의 엄격한 운영 및 관리 강화, ▲예타의 신속성·유연성·투명성 향상, 그리고 ▲예타 평가의 내실화를 목표로 하고 있다.

첫 번째로, 예타 제도의 효과적인 운영 및 관리 강화를 위한 주요 세부 개편방안은 ‘면제요건의 구체화 및 엄격한 적용’이다. 2017년 5월부터 2022년 4월까지의 5년 동안 예타 면제 건수는 총 149건에 이르며, 이는 총 120.1조 원의 규모에 달한다. 이전에 2008년부터 2012년까지 61.1조 원(90건), 그리고 2013년부터 2017년 5월까지 25조 원(94건)의 예타 면제가 있었던 것을 고려할 때, 최근의 증가 추세가 두드러진다. 이러한 상황을 반영하여 기획재정부는 이전에 불명확했던 「국가재정법」 제38조(예비타당성조사) 제2항의 면제요건을 더욱 구체화하여 「예타 운용지침」 제 20조(면제사업)에 명문화하고, 이를 엄격히 적용함으로써 예타 면제를 최소화하는 방안을 제시하였다. 다음 <표 2>⁷⁾는 그 주요 내용을 항목별로 정리한 것이다.

6) 본문에 기술한 내용 외에도 ‘복지사업 평가·검증기준 강화’, ‘사업 주무부처 참여확대’, ‘지도 기반 예타 정보서비스 제공’, ‘사업별 특수성을 반영한 정책성 분석 및 지역균형발전 분석 개선’, ‘ICT 기반 종합평가 도입’ 등 다양한 개편 방안이 제시되었다.

7) (2023. 10. 12. 기준) 제시된 면제요건 구체화(안)이 예타 운용지침에 반영되지 아니함.

자료: 관계부처 합동 발표자료. (2022. 9. 13.). “예비타당성조사 제도 개편 방안.” p. 6.

<표 2> 예비타당성조사 면제요건 구체화(안) 주요 내용

현행 면제요건 (국가재정법 제38조 제2항)	면제요건 구체화(안) (예타운용지침안)
문화재 복원사업	복원 외 관련 도로정비 등 주변정비사업이 전체 50% 이상인 경우 면제대상 제외
국가안보와 관계되거나 보안이 필요한 국방 관련 사업	민간과 경합하거나 수익자부담원칙에 의해 사용료가 부과되는 사업 등 비전력 부문 사업은 면제대상 제외
남북교류협력 또는 국가간 협약·조약에 따라 추진하는 사업	(남북교류협력) 남북교류협력추진협의회 의결을 받은 사업에 한해 면제 (협약·조약) 다른 국가 및 국제기구와 맺은 협약·조약 중 대통령 재가 또는 국회 동의를 받은 사업에 한해 면제

더불어, 예타 면제 이후의 관리를 강화하기 위하여 ‘사업계획 적정성 검토를 확대 실시’하는 개편방안이 제시되었다. 사업계획 적정성 검토는 예타 회피를 위한 의도적 사업규모 축소나 부실한 비용 검토 등을 막기 위하여 2008년에 도입된 ‘간이 예타’의 변경된 명칭으로, 투자의 규모를 중심으로 검토하는 방안이다.⁸⁾ 기존 제도에서는 국가재정법 제38조 제2항 제10호⁹⁾에 해당하는 면제사업에 한해서 사업계획 적정성 검토 실시가 의무화되어 있다.¹⁰⁾ 그러나 제10호 사유가 아닌 기타 사유로 면제된 사업의 경우 사업계획 적정성 검토를 실시해야 하는지에 대한 구체적 판단기준이 미비하다는 문제점이 있었다. 이를 보완하기 위해 사업계획 적정성 검토 대상사업을 확대하는 것으로 개편되었다. 구체적으로, 동법 제38조 제2항의 제1호(공공청사 등)¹¹⁾ 및 제8호(법령상 추진하여야 하는 사업)¹²⁾에 대해서도 사업계획 적정성 검토를 원칙적으로 실시하도록 변경되었다.

8) 국회예산정책처. (2014). 『국가재정법: 이해와 실제』.

9) 「국가재정법」 제38조(예비타당성조사) 제2항 제10호 지역균형발전, 긴급한 경제·사회적 상황 대응 등을 위하여 국가 정책적으로 추진이 필요한 사업(중전에 경제성 부족 등을 이유로 예비타당성 조사를 통과하지 못한 사업은 연계사업의 시행, 주변지역의 개발 등으로 해당사업과 관련한 경제·사회 여건이 변동하였거나, 예비타당성조사 결과 등을 반영하여 사업을 재기획한 경우에 한정한다)으로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 사업. 이 경우, 예비타당성조사 면제 사업의 내역 및 사유를 지체 없이 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

가. 사업목적 및 규모, 추진방안 등 구체적인 사업계획이 수립된 사업

나. 국가 정책적으로 추진이 필요하여 국무회의를 거쳐 확정된 사업

10) 「국가재정법」 제38조(예비타당성조사) 제5항 기획재정부장은 제2항 제10호에 따라 예비타당성조사를 면제한 사업에 대하여 예비타당성조사 방식에 준하여 사업의 중장기 재정소요, 재원조달 방안, 비용과 편익 등을 고려한 효율적 대안 등의 분석을 통하여 사업계획의 적정성을 검토하고, 그 결과를 예산편성에 반영하여야 한다.

11) 「국가재정법」 제38조(예비타당성조사) 제2항 제1호 공공청사, 교정시설, 초·중등 교육시설의 신·증축 사업.

본 개편안에서는 해당 시설의 사업 중에서도 ‘사업 규모 과다 산정 유인이 큰 사업(예: 호화청사)’을 예로 들어 제1호 면제사유인 사업계획 적정성 검토 전면 적용의 필요성을 제기하였음.

12) 개편방안에 따르면 제8호 면제사유에 해당하나 ‘내용상의 면제 사유가 뚜렷하지 않으면서 법령의 규정만을 토대로 면제된 사업’에 대해 사업계획 적정성을 필수적으로 검토해야 한다는 것이 제시됨.

두 번째로, 예타의 신속성·유연성·투명성을 향상시키기 위해 제시된 주요 개편방안은 ‘예타 대상사업의 기준금액의 상향조정’이다. 「국가재정법」에 따라 총사업비가 500억 원 이상이면서 국가재정이 300억 원 넘게 투입되는 사업의 경우 예타 절차를 필요로 한다. 1999년 예타가 처음 도입될 때 설정되었던 이 기준은 20년이 넘는 기간 동안 조정된 바 없어, 우리나라의 경제·재정적 규모가 확대된 현 상황에 적절하지 못하다는 지적을 받아왔다. 실제로 우리나라의 1999년 명목 GDP는 591조 원이었지만 2021년에는 약 3.5배 늘어난 2,072조 원으로 증가하였고, 본예산 기준 총지출 역시 약 3.8배, 1999년 145조 원에서 2021년 558조 원으로 증가하였다.¹³⁾ 이에, 정부는 SOC(Social Overhead Capital: 사회간접자본)¹⁴⁾ 및 R&D 사업의 예타 대상 기준을 총사업비 1,000억 원 및 국비 500억 원으로 상향조정하는 것을 추진하고 있다. 추가로, 500억 원에서 1,000억 원 사이의 사업에 대해서는 예타 지침을 준용하여 사업부처가 사전타당성조사 등을 통해 자체적으로 타당성을 검증하도록 한다.

세 번째로, 예타 평가 내실화를 위한 방법론 및 절차 개선과 관련된 세부 개편방안들이 발표되었다. 먼저, ‘경제성(B/C)¹⁵⁾ 분석에 있어서 다양한 편익을 반영’하도록 하는 방안이 있다. 현재 방법론상의 한계로 인해 안전·환경 및 삶의 질과 관련된 다양한 편익을 계량적으로 측정하기 어려우며, 그에 따라 경제성 분석에 온전히 반영될 수 없었다. 이를 개선하기 위해 새로운 개편안에서는 화폐화가 가능한 다양한 편익을 발굴하여 이를 경제성 분석에 반영하도록 한다. 예를 들어 코로나19 확산 이후 대규모 감염병 관리효과 등 다양한 의료부문의 편익이 발굴된 바, 이를 경제성 분석의 편익 항목으로 포함시키는 것이다. 금번 개편을 통해 향후에는 의료부문뿐만 아니라 다양한 부문별 편익을 추가 발굴토록 함으로써 확대 추진을 도모한다. 다음 <표 3>¹⁶⁾은 의료부문에서 추가 발굴한 편익(안)을 정리한 것이다.

또한, 종합평가(AHP¹⁷⁾) 수행체계와 방식을 개선하고자 하였다. 2000년부터 예타 제도에서는 AHP 기법을 사용하여 종합결론을 도출해왔으나, 종합평가를 수행하는 「재정사업평가 분과위원회」 평가 결과에 대한 객관성과 중립성 향상의 필요성이 지속적으로 제기되었다. 더불어, 현행

13) 관계부처 합동 발표자료. (2022. 9. 13.). “예비타당성조사 제도 개편 방안.” p. 11.

14) 2023년 4월 12일 국회 기획재정위원회 경제재정소위에서 통과된 국가재정법 개정안에 따르면, SOC 사업의 범위는 ‘도로, 철도, 도시철도, 항만, 공항, 댐, 상수도, 하천 및 관련 시설의 건설공사’로 정의됨.

15) B/C(Benefit/Cost) 분석: 편익-비용 분석.

16) 자료: 관계부처 합동 발표자료. (2022. 9. 13.). “예비타당성조사 제도 개편 방안.” p. 13.

17) AHP: Analytic Hierarchy Process(계층화 분석기법)

방식에서는 평가위원들의 의사결정에 영향을 주는 것을 방지하기 위해 B/C값을 공개하지 않았으나 이 방식이 오히려 해당 사업에 대한 종합적이고 균형 잡힌 평가를 저해한다는 지적을 받았다. 이에 따라 분과위원의 구성을 재조정¹⁸⁾하고 B/C값을 범주화하여 제공함으로써¹⁹⁾ 평가 정보를 확대 제공하는 개편안을 마련하였다.

<표 3> 예타 평가 내실화를 위한 방법론 개편안 중 의료부문 추가 발굴 편익(안)

분야	현행 편익	추가 발굴 편익
의료시설	• 원거리 의료시설 이용시간 및 이용 교통비 절감편익 • 응급사망 감소편익 • 대기시간 단축편익 등	• 대규모 감염병 관리효과(예방·확산방지) • 초기 집중재활치료를 통한 재원일수 감소효과 • 지역사회 보건사업 추진효과 • 특수질환군 전문치료센터 운영에 따른 환자의 사회복귀 개선효과 • 의료인력 대상 첨단시뮬레이션 중심 맞춤형 교육효과(의료사고 감소효과)

예타 평가 내실화를 위한 또 다른 세부 개편안으로는 ‘신속 예타 절차 도입’²⁰⁾ 및 ‘일반 예타절차 기간 단축’ 방안이 있다. 예타 수행기간은 평균 17.2개월(2021년 기준)²¹⁾로, 조사자료 획득의 지연, 사업계획의 일부 수정 또는 보완, 관계기관 협조 지연 등으로 인해 조사 기간이 연장되는 경우가 발생하기도 한다. 이러한 지연으로 인해 긴급한 경제 및 사회 상황 대응에 필요한 사업의 신속한 추진이 저해되고 있다는 비판이 있었다. 이를 개선하기 위하여 시급성이 인정되는 사업의 경우 ‘신속 예타절차’를 적용하여 예타 대상선정부터 조사완료까지 총 4개월을 단축²²⁾하도록 개편한다. 신속 예타절차가 적용되지 않는 일반 사업에 대해서도 예타 수행 기간이 최대 1년 6개월(철도 사업은 최대 2년)을 넘지 않도록 제한한다. 이렇게 개선된 절차를 통해, 정책 수요에 빠르게 대응하며 필요한 사업의 지연을 최소화하는 것을 목표로 한다.

이상의 내용을 토대로 보면, 예타 개편내용은 크게 제도 운영, 수행절차, 평가 방법론 측면으로 구분할 수 있다. 면제요건 구체화는 사전타당성 검토 제도에서도 이미 지침 개정을 통해 반영한

18) 분과위원 수 확대(10인→12인), 평가 시 최고·최저 점수 2개씩 제외(현재는 1개씩 제외하고 있음) 후 산술평균

19) 예: A ($B/C > 0.8$), B ($B/C < 0.8$)

20) (신속예타요건) 1) 타 법률에 예타신속처리 규정이 있는 사업, 안전관리 및 긴급한 경제·사회적 상황 대응 등을 위해 신속한 조사가 필요한 사업으로, 2) 구체적 사업계획이 수립되어 있고, 3) 재정사업평가위원회에서 의결된 사업

21) 관계부처 합동 발표자료. (2022. 9. 13.). “예비타당성조사 제도 개편 방안.” p. 10.

22) 예타운용지침에 제시된 예타대상사업 선정기간을 2개월에서 1개월로 단축하고, 조사기간에서 3개월을 단축하도록 함(9개월에서 6개월로 단축, 철도 사업의 경우 12개월에서 9개월로 단축함).

바 있으며 신속한 수행 또한 사전타당성 검토와는 관련성이 떨어진다. 다만 수행절차 측면에서 사전타당성 검토에서도 급증한 건축공사비를 고려하여 대상사업 기준금액의 조정을 검토할 필요가 있으며 이와 연계하여 사업계획 적정성 검토의 활용도 필요할 것으로 판단된다. 또한 예타와 마찬가지로 수행지침, 방법론의 내실화는 사전타당성 검토에서도 필수적인 부분이다.

사전타당성 검토의 발전방향 고찰

대상사업 기준금액 상향 조정: 건축사업 200억 원 → 300억 원

예비타당성조사와 동일하게 사전타당성 검토 역시 제도를 시행한 2013년 이후로 대상사업의 총사업비 기준금액은 변동 없이 300억 원(건축사업은 200억 원) 이상, 500억 원 미만으로 유지하고 있다. 그러나 예비타당성조사에서 대상사업 기준금액의 상향 조정을 추진하고 있는 현시점에서 사전타당성 검토 역시 이를 고려해 볼 필요가 있다고 판단된다. 그 이유로는 크게 건축공사비 상승으로 인한 사전타당성 검토 대상사업의 수가 증가하여 제도의 효율적인 운영에 부담이 될 수 있다는 점과 사업 완료까지의 소요기간이 장기화되어 실제 복무여건 및 복지 개선이 적기에 이루어지지 못할 가능성을 들 수 있다.


먼저, <그림 1>과 같이 건설투자 GDP 디플레이터가 최근 10년, 특히 코로나19 팬데믹 이후 급격히 증가한 것을 알 수 있다. 이러한 경향은 건설공사비지수에서도 확인할 수 있으며²³⁾ 앞선 2건의 국방논단에서도 원자재 가격 상승으로 인한 건축공사비, 시설 유지보수비 증가를 언급한 바 있다.²⁴⁾ 이로 인해 향후 추진될 시설 분야 신규 사업 중 사전타당성 검토 대상사업에 해당하는 경우 역시 증가할 것으로 예상된다. “국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침”의 시설별 공사단가 중 행정시설(1,000㎡ 이상)을 기준으로 단순 비교해 보면 '14년도 공사단가는 1,472천 원/㎡, '24년도 공사단가는 2,339천 원/㎡으로 기준금액 200억 원을 공사단가로 나누면 각각 13,587㎡, 8,551㎡이다.²⁵⁾ 공사단가는 10년 사이에 59% 증가하였고 이에 따라 200억 원 한도 내에서 신축할 수 있는 대략적인 연면적은 약 37% 감소하였다. 즉, 기존에는 사전타당성 검토

23) '14년 1월 99.1, '19년 1월 115.96, '23년 1월 150.84 (자료: 국가통계포털)

24) 홍종현·최서준. (2022). “글로벌 인플레이션에 대비한 국방시설사업 추진 준비사항.” 『국방논단』, 제1914호. 한국국방연구원; 곽한성. (2023). “주요 건설자재 가격 변화에 따른 군 시설물 유지보수비 변동성 추정.” 『국방논단』, 제1953호. 한국국방연구원.

25) 실제 총사업비 산출에서는 설계비, 감리비 등 시설부대경비를 포함해야 하나 본고에서는 비교를 위해 단순화하여 계산하였음.

대상이 아니었던 사업이 현재 시점에서는 해당될 수 있다는 의미이며 이는 제도 운영 인력과 예산, 그리고 연간 연구수행에 현실적인 한계가 있는 상황에서 부담으로 작용할 수 있다.²⁶⁾ 그러므로 대상사업 기준금액을 상향 조정하되 변화의 영향을 최소화하는 수준에서, 현재 건축사업만 예외적으로 200억 원 이상인 부분을 300억 원으로 조정하는 것을 고려해볼 수 있겠다.

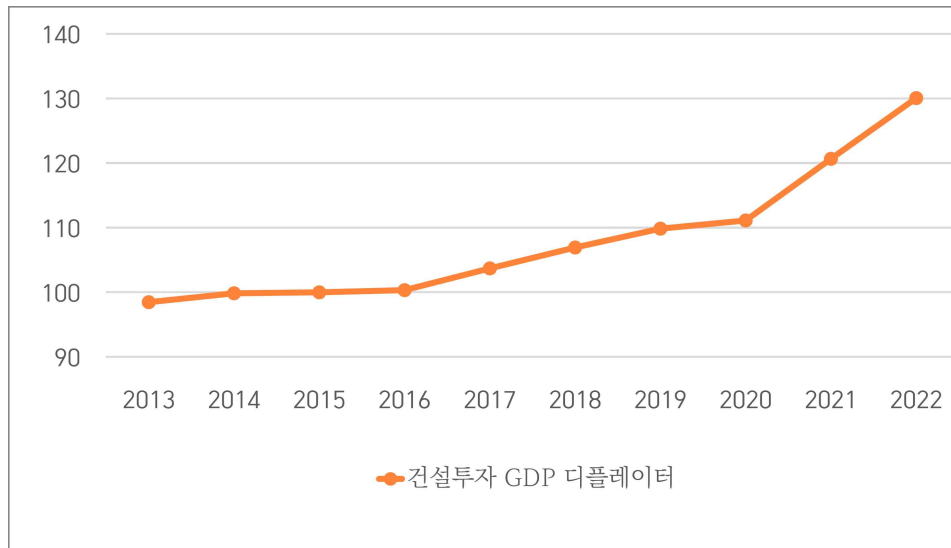

<그림 1> 건설투자 GDP 디플레이터 추이(2013~2022)

사업계획 적정성 검토 활용

사전타당성 검토 제도에서도 면제된 사업 중에서 필요한 경우 사업계획 적정성 검토를 실시하는 것을 개선방안 중 하나로 고려해 볼 수 있다. 그동안 사업계획 적정성 검토를 수행한 사례는 없으나 향후 사전타당성 검토의 수요 증가 또는 200~300억 원 규모의 사업이 대상에서 제외되는 경우를 대비하여 그 활용도를 제고시키는 것이다. 즉, 연평균 사전타당성 검토 3건을 수행하고 있는 여건을 고려하여 필요시 재정효율화심의위원회를 통해 사전타당성 검토와 사업계획 적정성 검토 수행 비중을 KIDA와 협의하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 사전타당성 검토 1건당 사업계획 적정성 검토 2건의 비율로 가정하여 1년에 사전타당성 검토 2건, 사업계획 적정성 검토 2건을

26) 2013~2023년 동안 수행하였거나 수행 중인 사전타당성 검토 31건 중 200억 원 이상 300억 원 미만 사업은 총 6건이었음.

수행할 수 있을 것이다. 이를 통해 건축사업의 기준금액이 300억 원 이상으로 상향될 경우 사업계획 적정성 검토를 200~300억 원 미만 사업에 대한 최소한의 안전장치 역할로 활용할 수 있다. 다른 한편으로, 건축공사비 상승으로 인해 사전타당성 검토의 수요가 증가할 경우 한정된 연구량을 효율적으로 활용하여 사전타당성 검토 연구의 질을 유지하면서 그 수요에 대응하기 위한 목적으로도 사업계획 적정성 검토를 활용할 수 있다. 다만, 현재 지침상에는 면제 사업에 대해서만 사업계획 적정성 검토를 실시할 수 있으므로 앞서 언급한 두 가지 경우 모두 지침상 수행이 가능하도록 내용을 개정하는 절차가 선행되어야 할 것이다.

수행지침의 지속적인 최신화, 고도화 추진

예타는 과거부터 지속적으로 수행절차 및 방법론을 보완, 발전해오고 있고 앞서 정리한 바와 같이 가장 최근의 개편에서는 다양한 편익 발굴, 종합평가 수행체계·방식 개선 등의 내실화를 추진하고 있다. 예타는 그 결과가 국가 및 지역경제에 미치는 파급효과가 크기 때문에 국민적 관심도 높아 보다 정교하고 체계적, 합리적인 절차를 거친 결과 도출이 필수적이다. 사전타당성 검토도 마찬가지로 변화하는 제도, 환경, 여건 등을 적기에 반영하여 합리적이고 객관적인 결과를 도출하기 위해 수행지침상의 절차 및 방법론을 지속적으로 개선하고 발전시켜야 한다. 다만, 사전타당성 검토는 편익보다는 비용의 타당성 검토에 중점을 두고 있으므로²⁷⁾ 이 부분을 중심으로 최신화, 정교화를 추진해야 할 것이다. 2023년에 KIDA에서 새로이 개발한 “국방시설사업 분석평가 수행지침”은 사업타당성조사와 사전타당성 검토를 포괄하고 있으며 수행절차 및 비용 추정, 검토 방법론을 상세히 정립하였다. 앞으로 이 수행지침의 지속적인 고도화를 위해 KIDA와 국방부 및 각 군, 국방시설본부 등 유관기관은 활발하게 의견을 교환하고 소통해야 할 것이다. 지난 2020년부터 연면적 1,000㎡ 이상 공공 건물을 대상으로 의무화된 제로에너지건축물 인증제 사례와 같이 공사비에 영향을 미칠 수 있는 제도 및 환경, 여건의 변화를 선제적으로 파악하여 반영함으로써 보다 정확하고 신뢰성 있는 결과를 도출할 수 있도록 해야 한다. 이 과정에서 “국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침” 등 비용, 단가 기준이나 설계지침에 관련 내용이 반영되어 있지 않은 경우 연구진이 국방시설본부 등 협의를 통해 지침 개정을 제언할 수도 있을 것이다. //끝//

27) 국방 전력운영 분야 사업의 특성상 전투준비태세 강화, 복무 여건 개선 등의 효과를 경제적인 편익으로 추정하는 것은 난제에 해당함. 보다 자세한 내용은 다음의 국방논단 참조. 홍석수·이남석. (2019). “국방 전력운영사업 사전타당성 검토 제도의 성과와 향후 과제.” 『국방논단』, 제1744호. 한국국방연구원.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제1972호(12월22일)	박상현·박수현·김준규, F-15를 통해 보는 4세대 전투기의 미래
제1973호(12월29일)	김규현, 군 간부 징계제도 진단과 개선을 위한 제언
제1974호(1월 5일)	홍석수·이현재·김리아, 국방 전력운영사업 사전타당성 검토 발전방향
제1975호(1월16일)	김영곤, 학군장교(ROTC) 지원율 하락 요인과 개선방안

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.
