

국방논단

제2050호(25-27) 2025년 7월 14일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

방위력개선 패키지시설사업 발전 방향에 대한 소고

손윤진 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
thsdl88@kida.mil

강태원 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
twkang@kida.mil

우리 군은 즉시 전력화 및 준비태세 완비를 위해 주장비뿐만 아니라 시설, 인력, 교육·훈련, 군수 등 다양한 제반 요소가 함께 연계되어 확보될 수 있도록 노력하고 있다. 이 중 시설은 그 특수성으로 인해 특히 체계적인 관리가 필요한 요소임에 따라 방위력개선부문에서 패키지시설사업으로 진행되고 있으며, 이에 본고에서는 현재 패키지시설사업의 제한사항을 분석하고 그 발전 방향을 제시하였다. 제한사항으로는 첫째, 무기체계 신규 전력화가 다양한 유형의 시설 소요를 발생시킴에도 불구하고 패키지시설사업 대상에 대하여 관점에 따라 이견이 발생함에 따라 불필요한 행정소요를 초래하는 요인으로 작용하고 있으며, 둘째, 패키지시설사업이 원활히 진행되기 위해서는 방위사업청, 국방부, 소요군, 국방시설본부 등 다양한 유관기관의 조정·소통이 필요함에도 불구하고 현존하는 협의체는 집행단계 중심의 제한된 주제를 중심으로 운영되어 실효성이 높지 못한 측면이 존재하였다. 이를 개선하기 위한 발전방향으로 첫째, 방위사업청훈령인 패키지시설사업관리규정상 대상 사업에 대한 정의를 확대개정함으로써 국방부훈령과의 기준을 통일하여 일관된 사업 추진의 기반을 마련할 필요가 있으며, 둘째, 현존하는 유관기관 협업체계의 인력구성을 다변화하여 기존의 집행단계에 국한된 주제에서 보다 심도있는 논의가 가능한 여건을 마련할 필요가 있다.

서론

무기체계가 원활히 운영되기 위해서는 주장비뿐만 아니라 시설, 인력, 교육·훈련, 군수 등 다양한 제반 요소가 함께 필요하다. 그중에서도 시설은 주장비 전력화와 연계하여 획득하는 요소 중에서도 특히 체계적인 관리가 필요한 요소라고 할 수 있다. 전력화 이전에 시설이 미리 마련되어야 장비 도입 시 운용이 가능해지므로 주장비 계약보다 선행하여 시설공사가 착수되어야¹⁾ 할 뿐만 아니라, 시설공사 계획에는 부지매입, 설계, 시설공사 등 각 단계별 수행기간 및 계약 행정기간 등이 소요²⁾되는 등의 특수성을 고려해야 하기 때문이다.

이에 우리 군은 신규 무기체계 획득과 연계하여 시설을 확보함으로써 최종적으로 즉시 전력화 및 준비태세 완비를 보장하기 위하여 법과 훈령 등에 다양한 규정을 두고 있다. 먼저 방위사업법 제3조³⁾에서 방위력개선사업을 무기체계의 구매 및 연구개발뿐만 아니라 이에 수반되는 시설의 설치까지 폭넓게 정의하고 있다. 뿐만 아니라 전력발전업무훈령 제98조⁴⁾ 등을 통하여 방위력개선 사업분야 시설사업은 방위사업청에서 무기체계 전력화와 연계하여 추진하도록 규정하고 있다.

이에 따라 특정 무기체계 개발·도입에 따라 전력화에 필요한 시설의 경우 방위사업청 통합사업 관리팀(IPT, Integrated Project Team)⁵⁾에서 주장비와 함께 확보하는데 이를 패키지시설사업이라 한다. 본고에서는 패키지시설사업의 현황을 소개하고, 현재 패키지시설사업의 문제점을 분석함으로써 그 발전방향을 제시하고자 하였다.

1) 한국국방연구원. (2022). 국방시설사업의 이해와 시설공사비 분석사례: 패키지시설사업을 중심으로.

2) 방위사업청. (2019. 7. 16.). 패키지시설사업 업무매뉴얼, 방위사업청 매뉴얼 제2019-6호.

3) 방위사업법(법률 제20190호, 2024.2.6.) 제3조(정의)의 1 “방위력개선사업”이라 함은 군사력을 개선하기 위한 무기체계의 구매 및 신규개발·성능개량 등을 포함한 연구개발과 이에 수반되는 시설을 설치 등을 행하는 사업을 말한다.

4) 전력발전업무훈령 제98조(시설사업 원칙)의 ① “방위력개선사업분야 시설사업은 ...(중략)... 방위사업청에서 무기체계 전력화와 연계하여 추진한다.”

5) 소요 결정 이후 선행 연구단계부터 사업을 종결할 때까지의 중기계획을 세우고 예산을 요구하며 사업 내용과 예산사용계획을 구체화하고 사업 추진과 관련된 제반 업무를 관리하는 조직[출처: 국방부. (2013. 8.). 국방군수·전력용어사전]

방위력개선 패키지시설사업 현황

패키지시설사업 개념 및 예산

패키지시설사업의 정의는 패키지시설사업관리규정 제2조에 따라 “무기체계와 연계하여 일괄 확보되어야 하는 방위력 개선사업으로 추진되는 시설사업”을 의미한다. 시설의 구체적인 성격으로는 “전력화요소로서 무기체계의 운용·시험·훈련을 지원하거나 군수지원(저장·정비·보급)을 수행하는 데 필요한 부동산 및 설비 등”으로 규정하고 있다.

<표 1> 방위력개선 패키지시설사업 사업수 및 예산규모 추이

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	평균
사업수(건)	59	63	65	69	64
예산(억 원)	5,555	5,875	6,067	6,025	5,881

* 출처: 방위사업청. (2023. 11. 2.). 패키지시설사업 통합관리모델 수립 이행계획(안) 보고.


패키지시설은 전력화를 지원하는 요소 중 하나이기 때문에 패키지시설사업의 예산은 방위력개선사업 중 생산, 제조, 건조, 구매, 임차 등이 포함된 금액⁶⁾인 총사업비를 통하여 관리된다. 즉 패키지시설사업 예산은 방위력개선사업 총사업비를 구성하는 요소 중 하나이다. 패키지시설사업의 최근 추이를 살펴보면 <표 1>과 같이 4개년 평균 64건이며 예산은 5,881억 수준이다.

패키지시설사업의 절차

패키지시설사업의 획득은 주장비 무기체계와 연계하여 <그림 1>의 절차와 같이 진행되며, 주장비 무기체계의 예산 반영을 기점으로 크게 사업준비단계와 사업수행단계로 구분할 수 있다. 먼저 사업준비단계에서 패키지시설은 선행연구 수행지침 제13조⁷⁾ 및 방위사업관리규정 제39조⁸⁾ 등에 따라 개략계획이 수립된다. 하지만 이후에 본격적으로 진행될 사업수행단계 이전이라는 사업준비

6) 방위사업청. (2019. 7. 16.). 패키지시설사업 업무매뉴얼. 방위사업청 매뉴얼 제2019-6호.
 7) 선행연구 수행지침(방위사업청 예규 제930호, 시행 2024. 6. 3.) 제13조(선행연구 조사·분석 수행) 4항 “선행연구 수행기관은 패키지시설사업이 필요한 무기체계의 경우 합참·소요군의 협조를 받아 시설개요, 소요예산 등 개략계획을 도출하여야 한다.”
 8) 방위사업관리규정(방위사업훈령 제864호, 시행 2024. 7. 11.) 제39조[사업추진기본전략(안) 수립] 1항 6조(중점관리사항) 바. [필수, 해당사업] 패키지시설사업 개략계획

단계의 특성상 개략계획은 구체적인 근거에 의거하기보다는 선례 등을 참조하여 기초적인 수준에서 결정된다는 특징이 있다.

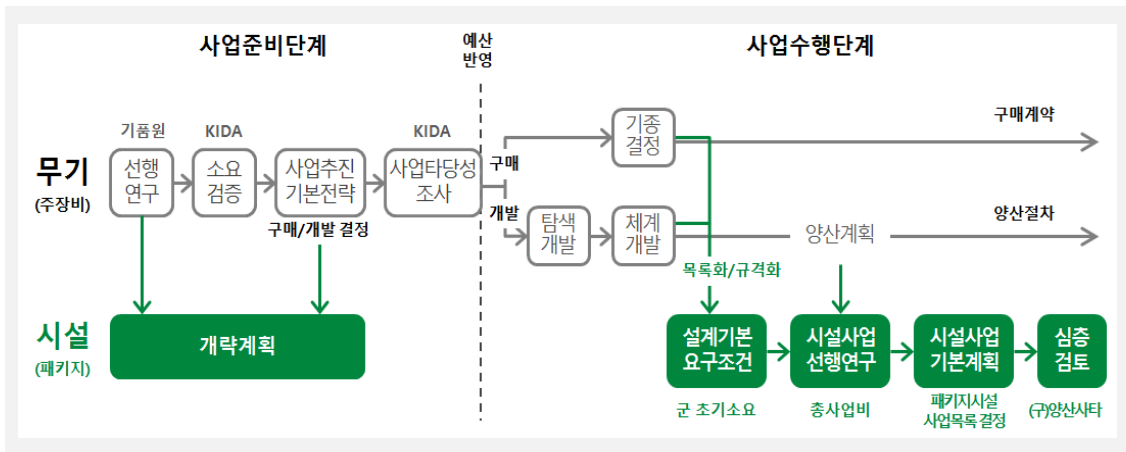

<그림 1> 주장비와 연계된 패키지시설사업 획득 절차

사업수행단계에서 패키지시설은 주장비 무기체계의 체계개발(연구개발) 및 기종결정(구매)이 완료되어 무기체계의 규격이나 수리부속·장비의 목록이 구체적으로 결정되는 규격화·목록화 이후에서야 구체적으로 논의되기 시작한다. 먼저 소요군은 건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면, 구조계산서, 시방서 등 공사에 필요한 서류의 작성 근거가 되는 초기 요구사항⁹⁾인 설계기본요구조건을 제출한다. 이를 기반으로 주장비 양산계획 시점에 시설사업선행연구를 통해 총사업비(안)를 산출하며, 이후 시설사업기본계획을 통해 시설사업의 현황·추진계획·대관협의·재원확보 등 업무수행을 합리적이고 경제적으로 수행¹⁰⁾하기 위한 사업추진방안을 결정하게 된다. 이를 기반으로 심층 검토를 수행하면 본격적으로 집행단계에 착수하게 된다.


9) 패키지시설사업관리규정(방위사업청훈령 제868호, 2024. 9. 10.) 제2조(정의) 제5항

10) 패키지시설사업관리규정(방위사업청훈령 제868호, 2024. 9. 10.) 제2조(정의) 제4항

패키지시설사업의 제한사항

대상 시설의 범위에 대한 통일된 업무 추진 한계

무기체계 신규 전력화는 다양한 시설 소요를 발생시키는데 이를 유형화하면 <그림 2>와 같이 크게 5가지로 정리할 수 있다. 신규 무기체계가 전력화되는 부대에서는 보급, 정비, 작전·훈련·행정 등 ①주장비를 운영하기 위한 시설이 필요하다. 하지만 직접적인 운영시설뿐만 아니라 활주로와 같이 기존의 타 무기체계와 함께 공용으로 사용되어 전반적인 플랫폼 개선에도 기여하는 ②공용기반시설 또한 발생할 수 있다. 이외에도 신규 전력화에 맞추어 부대를 재배치하거나 부지를 확보하기 위해 기존 시설을 철거하는 경우 이를 ③대체·복구하는 시설이 발생할 수 있는데, 이는 무기체계가 직접 활용하는 시설은 아니지만 전력화로 파생되는 시설이라 할 것이다.

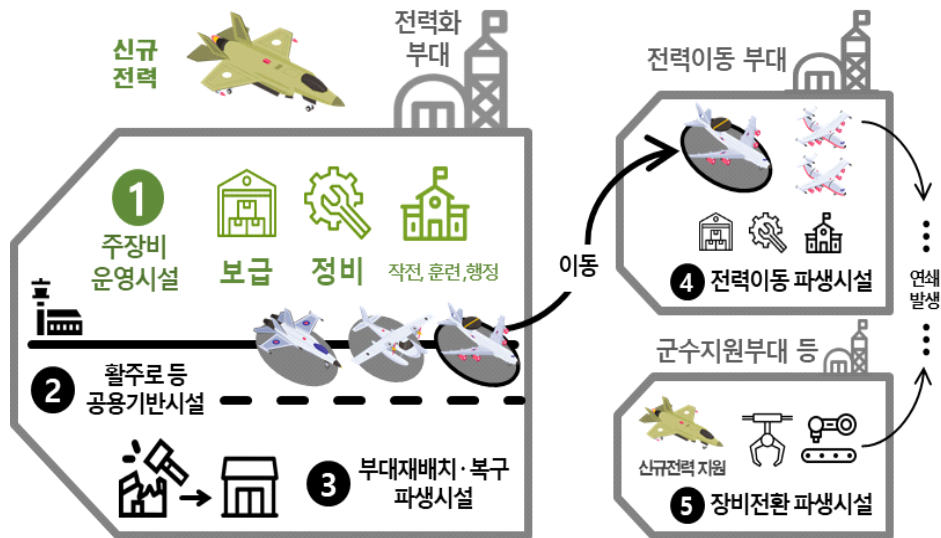

<그림 2> 전력화와 관련하여 발생할 수 있는 시설 유형

전력화로 파생되는 시설은 전력화부대뿐만 아니라 타 부대에서도 발생할 수 있으며, 대표적으로 전력이동과 장비전환이 있다. ④전력이동은 신규 전력화로 인해 기존 무기체계가 타 부대로 이동하는 경우로 이로 인해 타 부대에서 시설 소요가 발생할 수 있다. 뿐만 아니라 군수지원부대에서 전력화로 인한 ⑤장비전환으로 신규 정비라인을 설치하는 등 시설 소요가 발생할 수 있다.

이처럼 전력화부대 외 타 부대에서 발생하는 시설은 장기에 걸쳐 연쇄적으로 발생할 수 있어 식별 및 관리에 한계가 있다는 특징이 있다.

이처럼 신규 전력화는 직접적인 주장비 운영시설 외에도 다양한 유형의 시설 소요를 발생시키지만 이 중 어디까지가 패키지시설사업의 대상인지에 대해서는 이견이 존재한다. 패키지시설사업 관리규정 제2조에 따라 운용·시험·훈련 및 군수지원(저장·정비·보급)이라는 직접적인 주장비 운영시설로 한정하는 입장이 있는 반면, 원인자 부담의 원칙에 따라 신규 전력화가 발생시키는 공용 기반시설이나 파생시설까지 광의로 보는 입장이 있기 때문이다. 특히 전력발전업무훈령 제98조(시설사업의 원칙)¹¹⁾는 방위사업청과 협의하에 발전시켜야 하는 시설사업으로 직접적인 운용시설 뿐만 아니라 부대시설, 편의시설, 특수시설, 훈련시설 등 다양한 시설 유형을 함께 규정하고 있어 대상 시설의 범위에 대하여 규정 간 상충되는 측면이 존재하는 실정이다.

패키지시설 대상 사업의 범위에 대한 이견은 다양한 유형의 시설에서 사업별·관계기관별·담당자별 견해 차이를 발생시키는 요인이 될 수 있으며, 이는 통일성 있는 일관된 사업 추진에 저해요소로 작용한다. 특히 <그림 1>에서 살펴본 바와 같이 패키지시설사업은 사업준비단계부터 사업수행단계에서 전력화에 이르기까지 장기간 소요되며 그 사이 수많은 유관기관과 담당자가 상호작용하며 진행되기 때문에 업무 추진 과정상 비효율성을 야기하는 요인으로 작용할 수 있다.

유관기관 간 조정·협의를 위한 소통 한계

패키지시설사업이 원활히 진행되기 위해서는 다양한 유관기관과의 조정·협의를 필요하며, 대표적인 유형으로 크게 3가지를 들 수 있다. 먼저 소요군과 방위사업청 간의 소통이다. 방위력개선사업의 내용은 비밀인 경우가 많기 때문에 획득 절차상의 산출물을 예하부대에서 확보하거나 열람하기 어려운 경우가 많다. 즉 소요군에서 신규 무기체계의 사양 등에 대한 정보를 쉽게 접하기 힘든 여건이기 때문에 시설사업 준비에 시행착오를 유발하는 요인으로 작용할 수 있다.

두 번째는 국방부와 방위사업청의 부처 간 소통이다. 동일 부지에 전력운영사업과 방위력개선

11) 전력발전업무훈령(국방부훈령 제2845호, 2023. 9. 25.) 제98조(시설사업)의 2: ...(중략)... 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하고 방위사업청과 협의 하에 ...(중략)... 지속 발전 1. 현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단 2. 장비 운용에 필요한 부대시설 및 편의시설 건설 소요 3. 시험평가 실시장소 및 시설소요 4. 시설보안 및 전술적 측면 검토 5. 운용시설의 환경대책 6. 특수시설 및 훈련시설 소요

사업이 동시에 진행되는 경우 중복시설을 고려한 통합 추진뿐만 아니라 사업 간 공사일정이나 우선순위에 대한 조정·협이가 필요한 경우가 발생할 수 있다. 특히 <표 1>에서 살펴본 바와 같이 패키지시설사업이 연평균 64건임을 고려할 때 전력운영시설사업과 겹치는 주둔지가 다수 존재할 수 있다.

마지막으로 방위사업청과 국방시설본부 간 소통이다. 현재 패키지시설사업은 예산편성과 사업 관리의 주체가 이원화되어있다. 방위사업청은 시설사업기본계획을 수립하고 기본 계획을 근거로 예산을 편성하며, 국방시설본부는 설계 및 시공 관련 현장 감독 등 사업관리 전반을 담당한다. 이처럼 이원화된 업무체계는 책임감 분산으로 적극적인 사업 추진에 저해 요소로 작용할 수 있다.

이와 같은 다양한 조정·협의 필요성에 따라 유관기관 간 적극적인 소통 채널 확보를 위해 현재 전력화장비안전성점검회의나 패키지시설사업개선 Working Group 등 다양한 협업체계가 운영되고 있다. 하지만 현존하는 협업체계는 집행단계 이후의 제한된 주제를 중심으로 운영되고 있어 그 실효성에 한계가 있다. 예를 들어 전력화장비안전성점검회의는 당해연도에 전력화되는 무기체계의 담당자들이 모여 전력화지원요소를 총체적으로 검토하지만 이미 전력화가 당해연도로 임박하였기에 조정·협의 여지가 많지 않으며, 패키지시설사업개선 Working Group의 경우 방위사업청, 국방부, 국방시설본부, 각 군의 참여로 유관기관 간 협의의 범위가 넓어졌다는 의의가 있으나 최근(2023년)에 신설되었기에 논의 주제는 아직 예산집행 증대 등으로 제한적인 실정이다.

발전방향

패키지시설사업관리규정상 대상 시설의 정의 확대

패키지시설사업의 대상 시설 범위와 관련하여 발생하는 이견을 해결하기 위해서는 현재 가장 직접적인 규정인 패키지시설사업관리규정의 정의를 확대 개정하는 것이 필요하다. 현재 규정은 <표 2>와 같이 “운용·시험·훈련 및 군수지원(저장·정비·보급)”으로 주장비 운영시설에 한정되어 있으나, 신규 전력화는 그 외에도 공용기반시설, 대체·복구시설, 전력이동시설, 장비전환시설 등 다양한 유형의 시설 소요를 발생시키기 때문이다. 뿐만 아니라 현재 패키지시설사업관리규정의 정의는 방위사업청과 협의하에 발전시켜야 하는 시설사업으로 직접적인 운영시설 외 부대시설,

편의시설, 특수시설, 훈련시설 등 다양한 시설유형을 함께 규정하고 있는 전력발전업무훈련과도 상충되어 업무 추진에 혼란을 초래할 수 있으므로 이에 대한 통일이 필요하다 할 것이다.

따라서 <표 2>의 개정안에서 제시하는 바와 같이 운용·시험·훈련을 지원하거나 군수지원(저장·정비·보급)을 수행하는 데 필요한 부동산 및 설비 외에도 “이로 인해 수반되는 제반시설”이라는 문구를 추가함으로써 훈령 간 규정을 통일할 필요가 있다. 이를 통해 소요군은 다양한 유형의 시설소요를 조기에 식별하여 체계적으로 준비하는 근거가 될 수 있으며, 이후 패키지시설사업 절차에서 다양한 유관기관 및 담당자별 상이한 입장으로 초래되는 불필요한 행정소요를 감축할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 2> 패키지시설사업관리규정 제2조(정의)의1 개정(안)

현행	개정안
“패키지시설사업”이란 무기체계와 연계하여 일괄 확보되어야 하는 방위력 개선사업으로 추진되는 시설사업(방위력개선사업으로 추진되는 정보통신공사사업을 포함)으로, 시설은 전력화요소로서 무기체계의 운용·시험·훈련 을 지원하거나 군수지원(저장·정비·보급) 을 수행하는데 필요한 부동산 및 설비 등을 말한다.	“패키지시설사업”이란 무기체계와 연계하여 일괄 확보되어야 하는 방위력 개선사업으로 추진되는 시설사업(방위력개선사업으로 추진되는 정보통신공사사업을 포함)으로, 시설은 전력화요소로서 무기체계의 운용·시험·훈련 을 지원하거나 군수지원(저장·정비·보급) 을 수행하는데 필요한 부동산 및 설비 와 이로 인해 수반되는 제반시설 등을 말한다.

유관기관 협업체계 개선

현재 유관기관 간 집행단계의 제한된 주제를 중심으로 운영되고 있는 협의체를 개선하기 위해서는 시설사업 소 단계에 걸쳐 주요 현안에 종합적으로 공유 및 공동 대응할 수 있는 기반을 마련하는 것이 필요하다고 할 것이다. 이를 위해서는 기존의 협업체계인 패키지시설사업개선 Working Group의 인력 구성을 <표 3>과 같이 다변화하는 것이 필요하다. 기존의 인력 구성에서 국방부는 건설관리과 1명만 포함이었으나, 시설 중기·예산담당(계획예산관) 및 시설유형에 맞는 담당 사업국과 해당 전력 담당자까지 확대가 필요하다. 뿐만 아니라 소요군 또한 기존에는 시설장교 1명만 포함이었으나 해당 전력 담당자까지 확대함으로써 보다 심도 있는 논의 여건을 마련할 필요가 있다.

<표 3> 패키지시설사업개선 Working Group 인력 구성 개선(안)

구분	과(팀)	인원	역할
방위사업청	방위사업분석과	1명	팀장(국장)
		1명	총괄(방위사업분석과장)
		3명	세부계획 작성 등 기획, 시설전담부서 신설방안, 업무매뉴얼 개정 등
	기반전력사업총괄팀	1명	집행지원 원인분석 등 매뉴얼 작성 및 제도개선, 협의체 구성
	미래전력사업총괄팀	1명	
국방부	계획예산관	1~2명	중기 및 예산 시설담당 각 1명
	각 사업국 (군사시설기획관, 보건복지관, 정책기획관, 동원기획관)	1~4명	전력운영 시설사업 관리
	전력정책국	전력별 1명	전력 담당자
국방시설본부	건설계획과	2명	대관협의, 설계 및 공사관리 등
각 군	육·해·공군·해병대	군별 1명	소요제기/시설부지 확보/통합관리
		전력별 1명	전력담당자

* 파란 글씨: 기존 인력구성에서 개선안

이와 같은 인력 구성의 확장을 바탕으로 기존의 집행단계 예산집행 중심의 제한적 논의 주제를 다변화할 필요가 있다. 단기적으로는 패키지시설사업에서 사업준비단계와 사업수행단계 등 소 단계에 걸친 이슈 대응으로 확장할 필요가 있으며, 중·장기적으로는 동일 부지에 방위력개선과 전력운영시설사업이 동시에 진행되는 경우 기획·계획단계에 조정·협의로 확장하여야 할 것이다. 이를 통해 기존의 집행 위주 사후적 협의체제를 보다 실효성 있게 개선함으로써 향후 본격적인 집행 단계에서 발생 가능한 현안 및 애로사항을 예방하여 원활한 사업 추진을 보장할 수 있는 기반이 마련될 수 있을 것이다. 특히 패키지시설사업의 대상 시설의 범위가 확대된다면 그에 따라 사업의 이해관계자 또한 확대될 가능성이 높으므로 협업체계의 개선이 더욱 필요하다고 할 것이다.

결론

이상 본고에서는 패키지시설사업 대상 범위에 대한 이견과 집행단계에 제한적 주제 중심의 협의체를 개선하기 위하여 패키지시설사업관리규정상 정의의 확대 개정과 유관기관 협업체계의 인력 구성 다변화를 제시하였다. 하지만 무기체계 즉시 전력화 및 준비태세 완비를 보장하기 위해서는 시설뿐만 아니라 교육훈련, 인력, 군수, 교리 등 다양한 요소 또한 뒷받침이 필요하다. 따라서 패키지시설사업을 기반으로 타 요소에 대해서도 현황에 대한 진단 및 분석을 통해 개선점이 있는지 파악하고 발전시키려는 노력이 필요하다. 이를 통해 획득과 운영유지 연계라는 더 큰 차원의 가치를 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2048호(6월30일)	박지훈, 승리이론 관점에서 바라본 러시아우크라이나 전쟁
제2049호(7월 7일)	편도후·서영희, 해외 주요 군의 전파관리 동향 및 시사점
제2050호(7월14일)	손윤진·강태원, 방위력개선 패키지시설사업 발전 방향에 대한 소고
제2051호(7월21일)	최공영·진아연, 방산수출 포스트세일즈를 위한 군의 역할과 과제

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.
