

국방논단

제2042호(25-19) 2025년 5월 19일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

방위력개선사업 심층검토 제도 효율화 방안

조봉재 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
chobj@kida.mil

고광춘 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
kcgo@kida.mil

박정현 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
jhpark823@kida.mil

기획재정부는 효율적 재정관리를 위하여 국방연구개발 사업 등 총사업비가 500억 원 이상인 사업에 대하여 연구개발 및 양산단계에서 각각 사업타당성조사를 수행하였으나 '23년 12월 국방혁신위원회 3차 회의 이후에 획득절차 효율화를 위하여 양산단계 사업타당성조사를 폐지하고 양산단계 총사업비 판단을 위한 심층검토 제도를 신설하였다. 양산단계 사업의 총사업비를 검토하는 심층검토를 위해서는 사전에 양산 총사업비에 대한 방위사업청의 계획수립이 선행되어야 하나 '24년 심층검토 수행결과, 대부분의 대상 사업에서 양산단계 사업의 총사업비에 대한 계획이 부실한 상태로 심층검토 연구가 요구되는 문제점이 식별되었다. 심층검토 수행 간 불확실한 계획으로 인하여 해당 비용이 총사업비에서 누락되면 향후 사업이 구체화되면서 총사업비 변동이 발생할 수 있고 이 경우에 사업타당성조사 재검증 등 또 다른 절차 수행으로 획득 기간 단축이라는 심층검토 취지에 맞지 않는 상황이 발생할 수 있다.

본고에서는 심층검토 제도가 신설된 의미에 대해 고찰하고 심층검토 제도 신설 이후 1년간 심층검토를 수행하면서 발생한 문제점을 식별하여 심층검토 제도의 효율화 방안을 다음과 같이 제안하였다. 첫째, 심층검토 대상 사업의 신뢰성 있는 총사업비 추정을 위하여 분석·평가를 시행할 필요가 있다. 둘째, 심층검토 총사업비 요구서를 구체화할 필요가 있다. 향후 심층검토 제도 안정화를 위하여 관련 지침과 규정을 보완하고 부처 간 문제 상황에 대한 인식 공유를 통하여 심층검토 제도 발전을 위한 노력이 필요하다.

지난 '23년 12월 국방혁신위원회 3차 회의에서 감시·정찰 능력 증강계획과 국방획득체계 혁신 방안이 다루어졌다. 특히, 발표된 국방획득체계 혁신방안에 따르면 정부는 획득방법을 기존 2가지(구매, 연구개발)에서 3가지(신속 소요, 시험사업 후 획득, S/W 획득)를 더한 5가지로 다변화하고, 기존 획득절차 중 중복적인 검증·분석 절차를 통합 수행토록 효율화를 추진하려는 계획을 세웠다.¹⁾ 계획에 따르면, 획득절차의 효율화 측면에서 기존의 획득절차 대비 크게 2가지 측면에서 획득 기간 단축을 위한 제도개선이 논의되었다.

첫째는 순차적 소요기획을 통합 소요기획으로 변경하는 것이다. 이 절차가 정립되면 소요제기 후 순차적으로 수행하던 소요결정, 선행연구, 소요검증 같은 분석·연구 활동을 하나로 통합해 수행할 수 있게 되며, 과거 순차적으로 수행하던 분석과 연구를 동시에 진행함으로써 사업추진전략을 적기에 수립할 경우 통상 7년가량 소요되던 기획·계획 기간을 4년 정도 단축할 수 있을 것으로 국방부는 판단하고 있다.²⁾

두 번째는 획득기간 단축을 위하여 양산단계 사업타당성조사를 생략하는 것이다. 국방사업 중에서 국방연구개발 사업 등 총사업비가 500억 원 이상인 사업에 대한 효율적 재정관리를 위하여 사업타당성조사를 실시하고 있다. 사업타당성조사는 연구개발 및 양산단계에서 각각 수행하였으나, 결론적으로 기획재정부는 '24년 2월 「국방사업 총사업비 관리지침」을 개정하면서 국방획득사업의 예산 반영 전 수행하는 사업타당성조사 중 양산 사업타당성조사를 폐지하고 양산단계 총사업비 판단을 위한 심층검토 제도를 신설하였다. 방위사업청도 「방위사업관리규정」을 '24년 3월에 개정하면서 심층검토 대상 사업은 잠정전투용적합 판정을 받거나 개발시험평가 결과 기준충족 판정을 받은 사업에 대하여 심층검토를 요청할 수 있도록 명시하였다.

양산단계 사업의 총사업비를 검토하는 심층검토를 위해서는 사전에 양산 총사업비에 대한 방위사업청의 계획수립이 선행되어야 하나 '24년 심층검토 수행결과, 대부분의 대상 사업에서 양산단계 사업의 총사업비에 대한 계획이 부실한 상태로 심층검토 연구가 요구되는 문제점이 식별되었다.

심층검토는 「방위사업관리규정」에 따라서 잠정전투용적합 또는 개발시험평가 결과까지만 도출된 사업이 연구 대상으로 선정되므로 사업추진 시점상 양산계획의 구체화가 제한되는 문제가 있다. 물

1) 『중앙일보』, “윤 대통령 전력 획득 속도내라 ‘…국방부’ 14→7년 줄이겠다.” (23. 12. 21.).

2) 『뉴스투데이(김한경)』, “국방 연구개발 혁신을 위한 ‘통합기술기획’ 추진 본격화 필요.” (24. 10. 10.).

론 심층검토는 사업타당성조사와 다르게 사업계획에 대한 적절성 검토를 수행하지 않고 소요량과 총사업비 위주로 검토 범위를 한정하여 연구를 수행하므로 일반적인 사업타당성조사 대비 양산계획의 구체성에 대하여 높은 수준이 요구되지 않을 수 있다. 하지만 심층검토 대상 사업의 신뢰성 있는 양산비 도출을 위해서는 양산비에 대한 구체적인 계획을 마련하고 대상으로 선정할 필요가 있다.

본고에서는 획득절차 효율화를 위해 시행 중인 심층검토 제도에 대하여 논한다. 특히, 양산비에 대한 구체적인 계획이 마련된 사업을 대상으로 심층검토 대상 사업을 선정하는 것에 대한 의미를 고찰하고 심층검토 제도 효율화를 위한 방안을 제시한다. 그러기 위하여 지난 '24년에 수행한 심층검토 내용을 살펴보고 발생한 문제점, 현재 「국방사업 총사업비관리지침」과 「방위사업관리규정」의 한계점과 원활한 심층검토 수행을 위한 방위사업청의 계획 구체화 방안을 도출하였다.

심층검토 관련 지침 및 규정

「국방사업 총사업비관리지침」 제1조에 따르면, 이 지침은 국가의 예산 또는 기금으로 시행하는 대규모 국방사업의 총사업비를 사업추진 단계별로 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 제고함을 목적으로 한다. 제3조에서는 총사업비가 500억 원 이상인 연구개발·구매·토목 및 정보화 사업 등을 총사업비 관리대상으로 정하고 있다. 제6조에서는 환율변동, 물가변동, 안전 또는 법령개정 등 불가피한 경우와 새로운 공법 또는 기술의 적용 등으로 사업의 효과가 대폭 개선되는 경우를 제외하고는 총사업비 관리 취지를 감안하여 총사업비 증액을 억제해야 함을 명시하고 있다. 즉, 기획재정부는 500억 원 이상인 국방사업에 대하여 재정지출 효율성을 목적으로 총사업비 관리를 시행하고 있으며 총사업비 관리를 위해 최대한 총사업비의 증액을 억제하도록 하고 있다.

또한, 총사업비 관리대상에 해당하는 사업은 제13조에 따라 사업타당성조사를 실시하고 있다.

<표 1> 총사업비 관리 측면 「국방사업 총사업비관리지침」

「국방사업 총사업비관리지침」(기획재정부, 2024. 2. 1. 개정)

제1조(목적) 이 지침은 「국가재정법」 제50조, 같은 법 시행령 제21조의 규정에 따라 국가의 예산 또는 기금으로 시행하는 대규모 국방사업의 총사업비를 사업추진 단계별로 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 제고함을 목적으로 한다.

제3조(관리대상 사업) ① 이 지침의 적용을 받는 관리대상 사업은 사업기간이 2년 이상인 국방사업으로서 다음 각 호에 해당하는 세부사업 또는 그 하위사업(이하 ‘사업’이라 한다)으로 하되, 매 회계년도에 반복되는 경상비적 성격의 사업과 극도의 보안을 요하는 비핵사업은 제외한다.

1. 총사업비가 500억원 이상인 연구개발·구매·토목 및 정보화 사업

제6조(총사업비 증액의 억제) 국방부장관 및 방위사업청장은 환율변동, 물가변동, 안전 또는 법령개정 등 불가피한 경우와 새로운 공법 또는 기술의 적용 등으로 사업의 효과가 대폭 개선되는 경우를 제외하고는 총사업비 관리의 취지를 감안하여 총사업비 증액을 억제하여야 한다.

제13조(사업타당성조사) 국방부장관 및 방위사업청장은 국방사업 중 「방위사업법」 제14조의2의 규정에 따라 대규모 신규사업에 대한 예산을 편성하기 위하여 사업 착수 이전에 사업의 추진과 관련된 사항을 투명하고 공정하게 점검하는 사업타당성조사를 실시하여야 한다.

심층검토와 관련된 내용은 「국방사업 총사업비관리지침」과 「방위사업관리규정」에서 확인할 수 있다. 「국방사업 총사업비관리지침」 내 심층검토와 관련된 조항을 살펴보면, 제22조에 사업타당성조사를 거친 사업 중에서 양산단계로 접어드는 사업에 대해 양산에 필요한 예산요구에 앞서 사업타당성조사 시 추정한 양산단계의 총사업비 등에 큰 변화가 없는지에 대한 검토를 위해 한국 국방연구원 등에 심층검토를 의뢰할 수 있고, 이를 근거로 예산과 총사업비 협의를 요구할 수 있도록 명시되어 있다. 심층검토 대상은 이미 사업타당성조사를 거친 사업이고 사업타당성조사는 총사업비 관리대상에 대하여 수행하므로 심층검토 대상 사업도 총사업비 관리대상에 포함된다. 따라서, 총사업비 관리 목적에 따라서 심층검토를 수행한 사업은 향후 사업 진행 간 최대한 총사업비 증액을 억제할 필요가 있다.

<표 2> 심층검토 관련 「국방사업 총사업비관리지침」

「국방사업 총사업비관리지침」(기획재정부, 2024. 2. 1. 개정)

제22조(사업타당성조사결과와 활용) ③ 국방부장관 및 방위사업청장은 이미 사업타당성조사를 거친 사업 중 본격적인 양산단계로 접어드는 사업에 대해서는 양산에 필요한 예산요구에 앞서 사업타당성조사시 추정한 양산 단계에서의 총사업비 등에 대한 큰 변화가 없는지 등에 대한 검토를 위해 한국국방연구원 등 전문연구기관에 심층검토를 의뢰할 수 있고, 이를 근거로 예산 및 총사업비 협의 등을 요구할 수 있다.

한편, 「방위사업관리규정」 제22조에서는 잠정전투용적합 또는 개발시험평가 결과 기준충족 판정을 받은 사업에 대하여 심층검토를 요청할 수 있도록 규정하고 있다. 통합사업관리팀은 심층검토 결과를 근거로 기획재정부에 양산 예산 및 총사업비 협의를 요구할 수 있다. 즉, 방위사업청은 심층검토 결과를 활용하여 예산을 반영하고 양산사업을 추진할 수 있으며 사업 진행 간 양산 총사업비가 증액되지 않도록 노력하여야 한다.


<표 3> 심층검토 관련 「방위사업관리규정」

「방위사업관리규정」(방위사업청, 2024. 3. 12. 개정)
제22조의2(양산 총사업비 심층검토) ① 통합사업관리팀장은 「국방사업 총사업비 관리지침」에 따라 연구개발사업타당성조사를 통해 추정한 양산 총사업비의 변동여부 등을 세부적으로 검토하기 위해 잠정전투용적합 또는 개발시험평가 결과 기준충족 판정을 받은 이후에 방위사업정책국장에게 양산 총사업비 심층검토 요청을 의뢰할 수 있다.
② 방위사업정책국장은 제1항에 따라 양산 총사업비 심층검토 요청을 의뢰받은 경우 한국국방연구원 등 전문연구기관에 분석을 의뢰하여야 하고, 그 결과를 통합사업관리팀장에게 통보한다.
③ 통합사업관리팀장은 제2항에 따른 양산 총사업비 심층검토 결과를 근거로 기획재정부장관에게 양산 예산 및 총사업비 협의 등을 요구할 수 있다.

획득절차 변경에 대한 이해

본고는 심층검토 효율화 측면에 대하여 논하므로 사업준비 단계의 통합소요기획에 대한 세부적인 설명³⁾은 생략하며, 사업관리 단계에서 심층검토 제도 신설에 따른 차이점 위주로 설명한다. 사업관리 단계를 살펴보면, 기존에는 추정 총사업비 500억 원 이상의 연구개발 사업을 대상으로 사업타당성조사를 거쳐 예산을 반영하고 연구개발, 시험평가를 거쳐 양산사업으로 전환하기 전에 양산단계 사업타당성조사를 실시하였다. 변경된 절차는 예산반영과 연구개발, 시험평가까지는 같은 절차로 수행되나, 양산사업 전환 시점에 양산단계 사업타당성조사 대신 심층검토 연구를 수행한다. <그림 1>에서 변경된 획득절차를 확인할 수 있다.

- 3) 통합소요기획 변경에 대한 이해는 참고로 제시 : 사업준비 단계에서 기존에는 합동참모회의를 통해 소요가 결정되면 선행연구와 소요검증을 수행하므로 만약 선행연구와 소요검증 연구결과 소요 수정사항이 식별되고 소요검증위원회에서 소요수정이 결정되면, 소요문서 수정 절차로 인한 획득절차 지연이 불가피함. 통합소요기획으로 변경된 이후에는 절차상 소요 기획단계에서 소요검증과 선행연구를 병행하여 추진하고 소요에 관한 이슈가 발견되면 그 결과를 반영하여 소요를 결정하므로 이전 대비 획득 기간 단축이 가능함.
- 4) 각 단계의 소요기간은 개별 사업의 특성과 사업 진행 여건 등에 따라 변경 가능

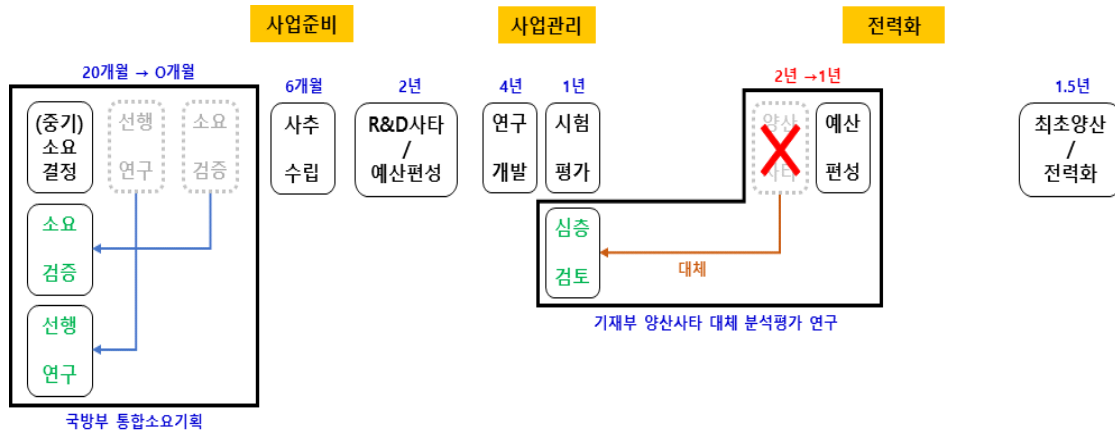

<그림 1> 통합소요기획, 심층검토 제도 신설에 따른 획득절차 변경사항

심층검토는 잠정전투용적합 또는 개발시험평가 결과 기준충족 판정을 받은 사업에 대해 수행하므로 양산 사업타당성조사 수행 시점 대비 앞 단계에서 연구를 수행한다. 따라서, 운용시험평가와 병행하여 연구를 수행할 수 있으므로 양산단계 사업타당성조사 기간인 6개월만큼 획득 기간 단축이 가능하다. 만약, 양산단계 사업타당성조사의 연구 기간이 정부 예산(안) 편성 시점인 6~8월과 겹치면 연구결과 도출이 제한되어 정부 예산(안) 반영이 안 될 수 있으며, 이 경우에 요구하는 시점보다 대략 1~2년가량 예산반영이 늦어질 수도 있다.⁵⁾ 이러한 경우를 고려하면 심층검토를 수행함으로써 양산단계 사업타당성조사 수행 기간과 더불어 추가적인 획득 기간 단축도 가능할 수 있다. 다만, 이러한 획득 기간 단축은 예산이 반영된 사업이 추가적인 총사업비 증액이나 감소 없이 계획된 예산대로 사업이 추진되어 마무리되는 경우를 전제로 한다. 하지만 이러한 전제는 개발시험평가 이후에 수행하는 심층검토 연구수행 시점에 따른 한계가 존재한다. 양산단계 사업타당성조사는 운용시험평가가 끝난 이후에 수행하기 때문에 어느 정도 양산단계에 필요한 군의 요구사항과 요구된 성능달성 정도 등이 고려되어 총사업비 추정이 가능하지만, 심층검토 연구수행 시점에서는 양산계획의 구체성 측면에서 한계가 존재할 수밖에 없고 이는 총사업비 변동요인으로 작용할 수 있다.

5) 2024년 예산안 편성 방향(대한민국 정책브리핑, 기획재정부, '23. 4. 3.) : 예산 편성 절차 - ① 각 부처 중기사업계획서 제출 (~1. 31.), ② 예산편성지침 확정(~3. 31.), ③ 정부예산안 편성(6~ 8.) 및 국회 제출(~9. 2.), ④ 국회 심의 및 예산안 확정(~12. 2.)

또한, 양산단계 사업타당성조사와 심층검토의 연구범위 및 결론의 형태에도 차이가 있다. 사업타당성조사는 소요의 필요성과 사업계획의 적절성, 추정 총사업비의 적정성을 살펴보고 사업추진을 계획된 예산으로 문제없이 추진할 수 있는지에 대해 전반적으로 연구하지만, 심층검토는 소요량의 적절성과 추정 총사업비의 적정성에 관해서만 연구하므로 사업타당성조사 대비 향후 사업추진 간 계획된 사업 범위나 총사업비의 변동 가능성이 클 수 있다.

「국방사업 총사업비관리지침」 제36조에 따르면, 총사업비가 최초 총사업비 대비 20% 이상 증가하거나 전략, 전술, 작전운영 개념 등의 변화로 해당 무기체계의 소요가 이전 대비 30% 이상 감소한 경우 타당성 재검증을 시행하여야 한다. 결론적으로 심층검토 연구범위 및 수행 시점의 한계에도 불구하고 획득 기간 단축이라는 심층검토 수행 취지와 「국방사업 총사업비관리지침」의 목적에 따라서 심층검토를 수행할 때 소요를 포함하여 향후 총사업비의 변동이 최대한 발생하지 않도록 적정 총사업비를 신뢰성 있게 추정하는 것이 중요하다.

심층검토 수행 문제점

한국국방연구원은 '24년 최초로 심층검토 연구를 수행⁶⁾하였으며, <표 4>와 같이 발생한 문제점을 크게 세 가지로 식별하였다. 첫째, 대부분 사업에서 심층검토 요구서 비용과 양산계획서(안)의 총사업비가 차이나는 문제가 발생하였다. 요구서는 심층검토 대상선정 시 사업추진 기관에서 양산 계약을 위해 요구하는 비용으로 기획재정부에 최초 총사업비로 확정을 요구하는 비용이다. 양산계획서는 양산사업 추진을 위한 계획으로 사업을 추진하기 위한 일정, 비용 등의 내용이 담겨 있는 문서이다. 따라서, 요구서 비용과 양산계획서(안)의 총사업비는 동일해야 한다. 둘째는 요구서에 누락된 비용이 발견되어 심층검토 연구수행 중에 반영을 요청하는 문제가 있었다. 누락된 비용은 주로 양산단계에서 필요한 비용으로 전투발전지원 및 통합체계지원 비용, 간접비 등이 다.⁷⁾ 셋째는 보조장비, 교육훈련 계획, 정비장비 소요 등 사업과 관련된 계획이 구체화되지 않은 문제가 있었다. 사업과 관련된 계획이 구체화되어 있지 않으면 향후 비용 증가의 요인으로 작용할 수 있다.

6) 한국국방연구원. (2025. 3. 31.). 『방위력개선사업 심층검토(2024)』.

7) 전투발전지원요소 : 소요군의 전투발전을 위하여 무기체계 획득과 연계하여 개발·획득하여 지원하는 요소(군사교리, 교육훈련 등), 통합체계지원요소 : 무기체계의 효율적이고 경제적 운용 보장을 위한 개발·획득·배치 및 운용에 수반되는 제반 군수지원요소(정비, 보급시설, 기술교범, 지원장비 등)

<표 4> 심층검토 수행 간 발생한 문제점

구분	A 사업	B 사업	B 사업	D 사업	E 사업
요구 비용 문제	- 요구서 비용과 양산계획서(안) 반영 비용 차이 - 요구서에 누락 비용 발생 - 창정비 방침(안) 미수립	- 요구서 비용과 양산계획서(안) 반영 비용 차이 - 요구서에 누락 비용 발생 - 양산사업에 대한 비용 항목 미식별	- 요구서 비용과 양산계획서(안) 반영 비용 차이 - 전투발전지원, 통합체계지원, 간접비 등 누락 비용 발생	- 요구서 비용과 양산계획서(안) 반영 비용 차이 - 요구서에 누락 비용 발생	사업 소요량 미확정(소요수정이 필요하였으나 미실시)
사업 계획 문제	- 보조장비 교체 수량 불명확 - 보조장비 노후화에 따른 교체 소요 불명확 (노후상태 미확인)		- 보조장비 비용 추가 요구 - 교육훈련, 경비 장비 등 소요 미구체화	장비 설치를 위한 기존 장비 철거 및 재설치 계획 미수립	

심층검토를 수행하면서 발생한 세 가지 문제점을 종합하면, 요구서 작성 시점에 실제 양산단계에서 필요한 비용 항목을 구체화하지 않고 심층검토 요구서를 작성하기 때문에 양산계획서(안)와 요구서 비용이 차이나고 비용 항목의 누락이 발생한다는 것이다. 또한, 보조장비 수량, 교육훈련 계획, 정비장비 확보 수량과 같은 계획들은 군과 협의가 필요한 사항이나 무기체계의 전력화는 미래의 상황이므로 군 여건에 따라서 확인이 어렵거나 사업주관 부서 등 여러 가지 상황적 요인으로 인해 개략적인 계획으로 요구서가 작성될 수 있다는 것이다. 따라서, 이러한 문제를 해결하기 위해서는 요구서, 즉 양산계획서(안)를 구체화한 상태에서 심층검토를 수행할 필요가 있다. 계획의 근거가 미비한 상태에서 비용이 요구되면 해당 비용에 대한 정확한 비용을 판단할 수 없고 그러면 해당 비용이 누락된 상태에서 양산비용을 추정할 수밖에 없다. 불확실한 비용으로 최초 총사업비가 확정되면 향후 양산 진행 간 추가적인 비용 증액이 발생할 수 있다. 이런 경우 「국방사업 총사업비관리지침」에 따라서 총사업비 분석 또는 사업타당성조사 재검증을 수행해야 하므로 획득 기간이 추가로 소요되는 문제가 발생한다.

심층검토 효율화 방안

심층검토 제도 신설의 취지와 수행하면서 발생한 문제점을 기반으로 심층검토 효율화 방안을 제시하고자 한다.

첫째, 심층검토 대상 사업의 신뢰성 있는 총사업비 추정을 위하여 심층검토 전에 분석·평가를 시행할 필요가 있다. <표 5>의 「방위사업법」 제23조에 따르면 방위사업청은 예산집행 전, 집행 중, 집행 후의 획득단계 전반에서 분석·평가를 시행할 수 있다.⁸⁾ 연구개발 사업의 경우 선행연구를 시행하며 획득방안, 일정, 비용에 대하여 분석을 하고 그 결과를 기반으로 사업추진기본전략을 수립한다. 즉, 사업계획서의 신뢰성을 높이기 위한 수단으로 분석·평가 결과를 활용한다.

<표 5> 분석·평가 관련 「방위사업법」

「방위사업법」(제17165호, 21. 4. 1.)

제5절 분석평가

제23조(분석·평가의 실시) ① 방위력개선사업을 수행함에 있어서 의사결정의 합리성을 도모하고 재원을 효율적으로 사용하기 위하여 방위력개선사업의 분석·평가체계를 확립하고, 이에 따라 분석·평가를 실시하여야 한다. <개정 2010. 3. 31.>

② 방위사업청장은 다음 각 호에 관한 분석·평가를 실시한다. <개정 2014. 5. 9.>

1. 당해 사업의 예산이 집행되기 전까지의 방위력개선사업분야의 중기계획 요구서 작성 및 예산편성 등에 필요한 분석·평가
2. 당해 사업의 예산이 집행되고 있는 과정에서 사업의 중간성과 등에 관한 분석·평가
3. 당해 사업의 예산집행이 완료된 후 사업의 집행성과 등에 관한 분석·평가

통상 무기체계 연구개발의 경우 수년간 진행되므로 양산단계 전환 시 불확실한 요소가 발생할 확률이 높다. 따라서, 최대한 정확한 비용을 추정하여 양산계획서를 작성할 필요가 있다. 심층검토 대상 사업은 양산단계 전환이 필요한 사업이므로 사업의 신뢰성 있는 총사업비 추정을 위하여 분석·평가를 시행할 필요가 있다. <표 6>의 「분석평가업무 실무지침」 제17조에서 양산사업에서 분석이 필요한 내용을 확인할 수 있다.

또한, 「국방전력발전업무훈령」 제88조⁹⁾상 전력화지원요소는 무기체계가 야전에 배치됨과 동시에 운용될 수 있도록 주장비와 동시에 전력화지원요소를 개발하여 확보하게 명시되어 있다. 따라

8) 분석·평가 수행과 관련된 추가 내용은 다음 규정 및 지침 참고 - 「방위사업관리규정」 제51조, 「분석평가 실무지침」(방사청 예규 제730호, 2021. 7. 23., 일부개정) 제5조, 제6조, 제3장 방위력개선사업 획득단계 비용분석

9) 「국방전력발전업무 훈령」 제88조(전력화지원요소 확보지침) ① 합참, 소요군 및 방사청은 영 제28조에 따라, 무기체계가 야전에 배치됨과 동시에 운용될 수 있도록 주장비와 동시에 전력화지원요소를 개발·확보한다.

서 이에 대한 비용까지 구체적으로 산출하여 반영할 필요가 있다. 한편, 분석·평가를 시행하면 그 기간만큼 획득 기간이 추가로 소요되기 때문에 획득 기간 단축이라는 심층검토 목적에 어긋나는 것이 아닌가에 대한 의문이 제기되기도 한다. 물론 단순히 절차가 추가된다는 측면에서는 추가적인 기간이 늘어날 수 있다. 다만, 분석·평가는 획득절차 전반에서 언제든지 할 수 있으므로 연구개발 수행 중에 병행하여 실시하면 기간적인 문제는 발생하지 않을 수 있다. 오히려 분석평가 대상 사업의 적체 문제 또는 수행기관의 연구 여력이 문제될 수 있다. 이러한 제한사항에도 불구하고 앞서 설명했듯이 심층검토 수행 전에 분석평가를 수행하는 것은 총사업비 관리의 효율성 향상을 위해 필요하다.

<표 6> 분석·평가 관련 「분석평가업무 실무지침」

제17조 (계획단계 사업분석 결과) ① 구매사업 및 양산사업 3. 분석결과 가. 사업의 필요성 나. 편성 및 운영계획의 적절성 다. 전력화시기 및 소요량 적정성 라. 작전운용성능 적합성·타당성	마. 전력화 지원요소 적절성 바. 부대계획의 합리성·적절성 사. 비용 대 효과분석 아. 계획예산의 타당성, 적정성 자. 상호운용성 확보계획의 적절성 차. 기타(유사관련사업과의 중복성·연계성 등)
---	---

둘째, 심층검토 총사업비 요구서를 구체화하여야 한다. 심층검토 요구서에는 <표 7>과 같이 대상 사업에 대한 사업 기간, 예상되는 사업비 등 사업내용이 수록되나 개략적인 내용으로 구성되어 양산계획서에 반영되는 사업내용 대비 충분한 내용을 담고 있지 않다. 특히, 연구개발 계약 전에 수행하였던 분석·평가 결과를 활용한 요구서의 총사업비 현황은 물가상승률이나 제 비율 등 최신 비용지표가 반영되어 있지 않고 재료비 견적도 과거 견적을 활용하여 작성되었으므로 현시점에서 비용 차이가 많이 발생할 수 있다. 그 밖의 전력화지원요소 비용도 마찬가지로 문제가 있을 수 있다. 만약 심층검토 요구서 작성을 위해 개발업체의 최신 원가자료를 받아서 요구서를 작성하여도 요구서 양식이 구체화되어 있지 않은 상태에서는 작성 담당자별로 작성 깊이와 범위가 다를 수 있다.

따라서, <표 8>, <표 9>와 같이 심층검토 요구서를 양산계획서에 반영할 수 있는 수준으로 구체화할 필요가 있다. 주장비는 주장비에 대한 재료비, 노무비, 경비 등 원가 값지, 을지 수준과 관련된 근거자료가 있어야 하며 전투발전지원 및 통합체계지원 비용 또한 구성 항목별 수량과 비용추정에서 활용한 유사사업 비용 등 관련 근거자료의 구비가 필요하다.

<표 7> 심층검토 요구서(현재)

구분	내용				
요구서 항목 중 총사업 비 현황	구분	사업기간	총사업비	세부 사업내용	산출근거
	연구개발				
	양산				

<표 8> 심층검토 요구서 구체화 예시

구분	주장비	보조장비	전투발전지원	통합체계지원	간접비
요구서 항목	재료비 노무비 경비 일반관리비 이윤	재료비 노무비 경비 일반관리비 이윤	구성 항목 비용과 해당 비용에 대한 견적서, 유사장비 또는 유사사업 실적 등 근거 자료	구성 항목 비용과 해당 비용에 대한 견적서, 유사장비 또는 유사사업 실적 등 근거 자료	일반 수용비, 국내여비, 사업추진비 등

<표 9> 심층검토 요구서 구체화 예시 : 주장비

구분	내용				
주장비	- 원가 감지, 을지 수준과 관련된 근거 자료 구비				
	(단위: 백만 원)				
	구분		요구비용	근거	
	재료비	직접재료비		예) 견적서 등	
		간접재료비			
		소계			
	노무비	직접노무비	노무공수	예) 유사사업 공수	
			임률 비용	예) '25년 기준	
		간접노무비	간접노무비율		
			비용		
		소계			
	경비	직접경비			
		간접경비	간접경비비율		
		소계			
	제조원가				
	일반관리비	일반관리비율			
		비용			
	총원가				
	이윤				
	계산가격				

마치며

심층검토 시행 이후 1년이 지난 시점에서 시행결과를 진단하면서 심층검토 대상 사업의 문제점을 식별하였다. 이를 종합하면, 요구하는 총사업비 계획이 구체화되지 않은 상태로 대상 사업이 선정되고 요구하는 비용의 근거가 불명확한 문제가 있다는 것이다. 불확실한 요구비용으로 인하여 해당 비용이 총사업비에서 누락되면 향후 사업 진행 간 총사업비 변동이 발생할 수 있고 이 경우에 사업 타당성조사 재검증 등 또 다른 절차 수행으로 획득 기간 단축이라는 심층검토 취지와 다른 상황이 발생할 수 있다는 것이다. 본고에서는 이러한 문제를 방지하기 위해 사전에 분석·평가 등을 통하여 심층검토 대상 사업의 계획적인 완성도를 높일 것을 제안하였다. 이를 위하여 관련 지침과 규정을 보완할 필요가 있으며, 이것이 제한될 경우 부처 간 문제 상황에 대한 인식 공유를 통하여 심층검토 요구서를 구체화하는 등 지속적인 노력을 기울일 필요가 있다. 이러한 노력이 향후 양산사업의 총사업비 변동 가능성을 조금이라도 완화할 수 있을 것으로 기대한다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2040호(5월 7일)	엄희송·남보배, 국방 초거대 AI(Artificial Intelligence) 구현방안에 대한 제언
제2041호(5월12일)	이남석, 중국의 기후변화 대응 전략과 함의: 글로벌 영향력 확대를 중심으로
제2042호(5월19일)	조봉제·고광춘·박정현, 방위력개선사업 심층검토 제도 효율화 방안
제2043호(5월26일)	김영곤, 중견간부 이탈 증가의 원인과 개선 방향
